Licenciada
Aura Marina Gómez Mazate
Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

## Licenciada Gómez Mazate:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el acta No. CCMAA-DGA-006-2023.

## Actividades realizadas:

- a. Se apoyó en los trabajos de limpieza del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- b. Se apoyó en los trabajos de desinfección del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- c. Se apoyó en los trabajos de liberación de agregados del segmento que se le fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- d. Otras actividades afines a su contrato.

## Resultados Obtenidos:

- En los días del 01 al 10 de febrero se inició con los trabajos de limpieza del segmento PA1 de la fachada poniente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
  - Como parte de dichos trabajos se utilizó herramientas de limpieza como cepillos metálicos para la remoción primaria superficial de elementos contaminantes, en la que se eliminaron partículas de polvo, residuos orgánicos e inorgánicos que puedan estar impregnados en la superficie.

- En los días del 13 al 17 de febrero se inició con los trabajos de desinfección del segmento PA1 de la fachada poniente del proyecto de revitalización. remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
  - Para poder realizar dichos trabajos se utilizó aspersores, brochas, cepillos con cerdas de plástico y cepillos con cerdas metálicas para hacer un tallado a profundidad, además de material químico diluido, tales como anti sarro, ácido muriático y ácido oxálico para eliminar todo el material orgánico e inorgánico que se ha impregnado en las superficies de manera profunda y las cuales se desinfectaron. Para realizar dicho trabajo se dio uso al equipo de seguridad industrial implementado para dichas labores, dentro del cual se encuentran gafas protectoras, casco, respirador con filtro, guante para manejo de químicos, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.
- En los días del 20 al 28 de febrero se inició con los trabajos de liberación de agregados segmento PA1 de la fachada poniente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
  - Para esta fase se utilizaron cinceles, martillos y pulidoras para lograr retirar los materiales de acabados como teselas dañadas, cernido, repello y mortero de pega utilizado para la adherencia de las mismas. Dentro del equipo de seguridad industrial se utilizó guantes protectores, gafas protectoras, casco, mascarillas o respirador, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.

ieda. Aura Marina Gómez Mazate

Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones Centro Cultural Miguel Angel Asturias Dirección General de las Artes Ministerio de Cultura y Deportes

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PRODUCTO

PRODUCTO DEL AÑO 2023

Dependencia: Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias No

Nombre: Carlos Alfonso Barrios Trinidad

Producto a Entregar: Único producto


						PE	SIOD	ODE	EL 01	AL.	28 D	ш	PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	SO DE	EL A	ÑO.	2023				
											FEB	FEBRERO	C								
ACTIVIDADES	10	02	03	90	07	80	60	10	13	14 1	15 1	16 17	7 20	21	22	23	3 24	27	28	Ų	
En los días del 01 al 10 de febrero					-				-						-						
se iniciaron a realizar los trabajos													-		_						
de limpieza del segmento PA1 de														-,							
la fachada poniente del proyecto	>	>	>	>		;	;	,			-										
de revitalización, remozamiento y	<	<	<	<	×	×	×	×					===			_					
restauración de las fachadas				-												_					
oriente y poniente del Centro				-					-												
Cultural Miguel Ángel Asturias.				5				44.					-								
En los días del 13 al 17 de febrero										-	-				-	L	-	ŀ	L		
se iniciaron a realizar los trabajos											-										
de desinfección del segmento PA1												_									
de la fachada poniente del									_			-		- 11							
proyecto de revitalización,									×	×	×	×	7420								
remozamiento y restauración de																					
las fachadas oriente y poniente del																					
Centro Cultural Miguel Angel					-																
Asturias.																					
En los días del 20 al 28 de febrero										-	-	-		L	L	-					
se iniciaron a realizar los trabajos				-								-			_				_		
de liberación de agregados del						-								_			_				
segmento PA1 de la fachada						-							-					_			
poniente del proyecto de													×	×	×	>	>	>	>		
revitalización, remozamiento y						-								•	<b>.</b>	<b>.</b>		< —	<		
restauración de las fachadas																					
oriente y poniente del Centro							-				_				-						
Cultural Miguel Ángel Asturias.							1 130	-			-	111					/	(			

Carlos Alfonso Barrios Trinidad

Vo. Bo


JEGA Aufra Martina Gómez Mazate Jefe de Departemento Sustantivo II en Funciones Centro Cultural Miguel Angel Asturias Dirección General de las Artes Ministerio de Cultura y Deportes


## 

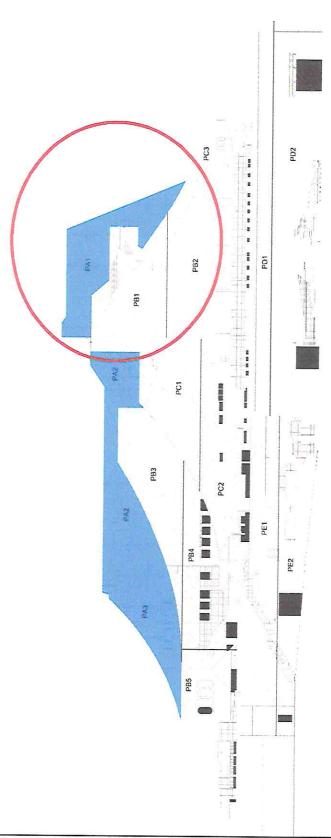

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE SECTORES DE LA FACHADA PONIENTE. SEGMENTO PA1 / ZONA AZUL

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TESELA DE TONALIDADES COLOR AZUL Y VERDE – SEGMENTO PA1.

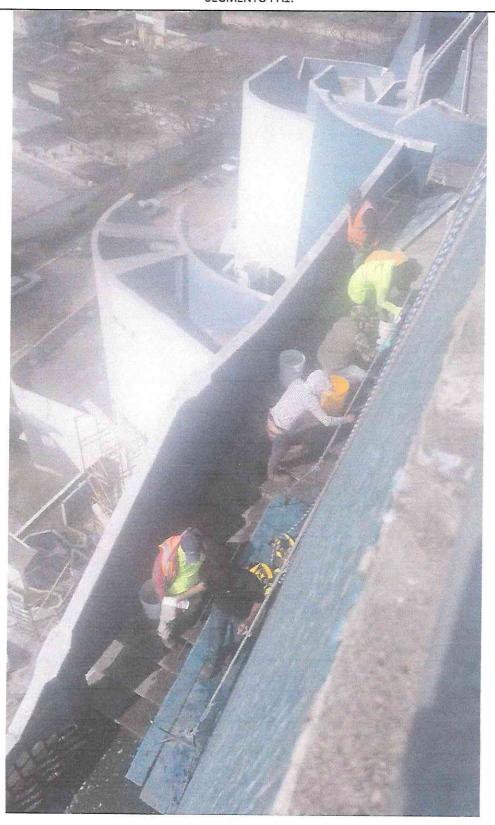

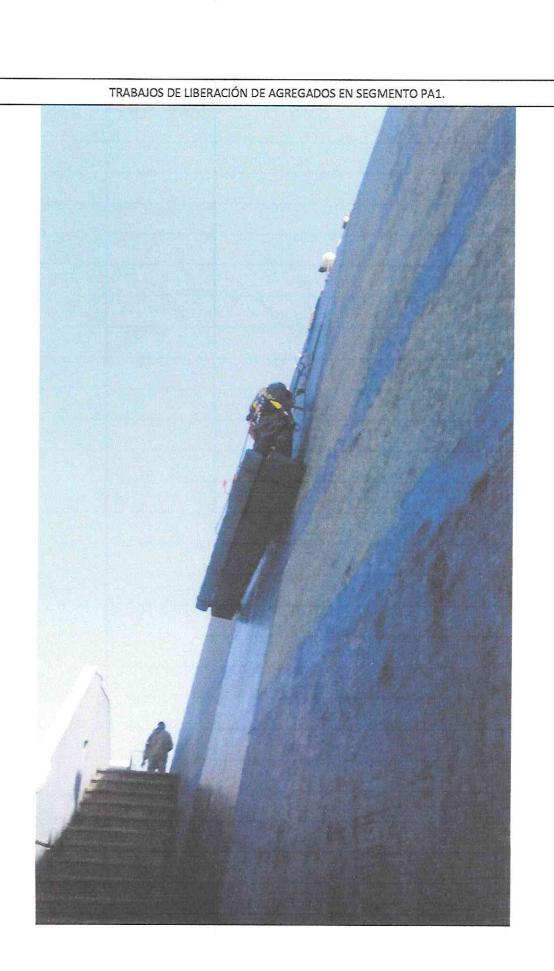

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TESELA DE TONALIDADES COLOR AZUL Y VERDE —

