Licenciada
Aura Marina Gómez Mazate
Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciada Aura Marina Gómez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el acta No. CCMAA-DGA-015-2023.

Actividades realizadas:

- a. Se apoyó en los trabajos de limpieza del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- b. Se apoyó en los trabajos de desinfección del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- c. Se apoyó en los trabajos de liberación de agregados del segmento que se le fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- d. Otras actividades afines a su contrato.

Resultados Obtenidos:

- En los días del 01 al 10 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de limpieza del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - Como parte de dichos trabajos se utilizó herramientas de limpieza como cepillos metálicos para la remoción primaria superficial de elementos contaminantes, en la que se eliminaron partículas de polvo, residuos orgánicos e inorgánicos que puedan estar impregnados en la superficie.

- En los días del 13 al 17 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de desinfección del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - Para poder realizar dichos trabajos se utilizó aspersores, brochas, cepillos con cerdas de plástico y cepillos con cerdas metálicas para hacer un tallado a profundidad, además de material químico diluido, tales como anti sarro, ácido muriático y ácido oxálico para eliminar todo el material orgánico e inorgánico que se ha impregnado en las superficies de manera profunda y las cuales se desinfectaron. Para realizar dicho trabajo se dio uso al equipo de seguridad industrial implementado para dichas labores, dentro del cual se encuentran gafas protectoras, casco, respirador con filtro, guante para manejo de químicos, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.
- En los días del 20 al 28 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de liberación de agregados del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - Para esta fase se utilizaron cinceles, martillos y pulidoras para lograr retirar los materiales de acabados como teselas dañadas, cernido, repello y mortero de pega utilizado para la adherencia de las mismas. Dentro del equipo de seguridad industrial se utilizó guantes protectores, gafas protectoras, casco, mascarillas o respirador, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.

Edy Fernando de la Cruz Méndez

Vo. Bo

Linta Aura Marina Gómez Mazate Jefe de Departemento Sustantivo II en Funciones Centro Cultural Miguel Angel Asturias Dirección Goneral de las Artes Ministerio de Cultura y Deportes

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PRODUCTO

PRODUCTO DEL AÑO 2023

Dependencia: Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias

Nombre: Edy Fernando de la Cruz Méndez

Producto a Entregar: Primer y único producto


						PER	PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023		.01/	AL 28	3 DE	FEB	RER(ODE	LAÑ	0 20	123			
										L.	EBR	FEBRERO								
ACTIVIDADES	2	02	03	90	0 20	0 80	00	10 13	3 14	1 15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	
En los días del 01 al 10 de febrero																				
se iniciaron a realizar los trabajos						_						-								
de limpieza del segmento A1 de la										-	_									
fachada oriente del proyecto de	>	>	>	_			-	_												
revitalización, remozamiento y	<	<	<	<	<u> </u>	` <	× ×			_					uuu-o					
restauración de las fachadas							-	_												
oriente y poniente del Centro																				
Cultural Miguel Ángel Asturias.						_	-													
En los días del 13 al 17 de febrero																				
se iniciaron a realizar los trabajos				-															_	
de desinfección del segmento A1					-															
de la fachada oriente del proyecto								_	-	-	×	>								
de revitalización, remozamiento y				2-19				<_	<	<		<								
restauración de las fachadas																				
oriente y poniente del Centro																			-	
Cultural Miguel Ángel Asturias.					-	-		-		_										
En los días del 20 al 28 de febrero																				
se iniciaron a realizar los trabajos				4																
de liberación de agregados del							-						1							
segmento A1 de la fachada oriente				-			-	_					×							
del proyecto de revitalización,														×	×	×	×	×	×	
remozamiento y restauración de				-															C .	
las fachadas oriente y poniente del					-															
Centro Cultural Miguel Ángel																				
Asturias.				_																

Vo. Bo

Lícda. Rura Marina Gómez Mazate Jefe de Departamento Susianivo II en Funciones Centro Cultural Miguel Angel Asturias Dirección General de las Artes Ministerio de Cultura y Deportes

Vo. H


Edy Fernando de la Cruz Méndez

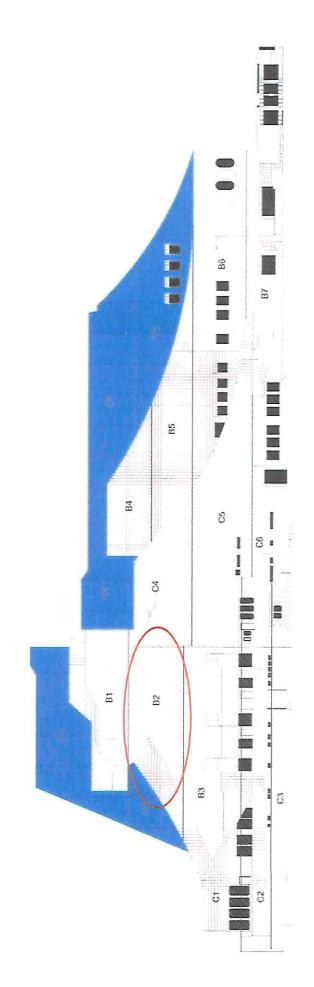


Esquema de ubicación de sectores de la fachada oriente. En el lado izquierdo en un círculo rojo se ubica el sector B2.



Limpieza y liberación de agregados de la tesela sobre la barandas de gradas en el sector B2.

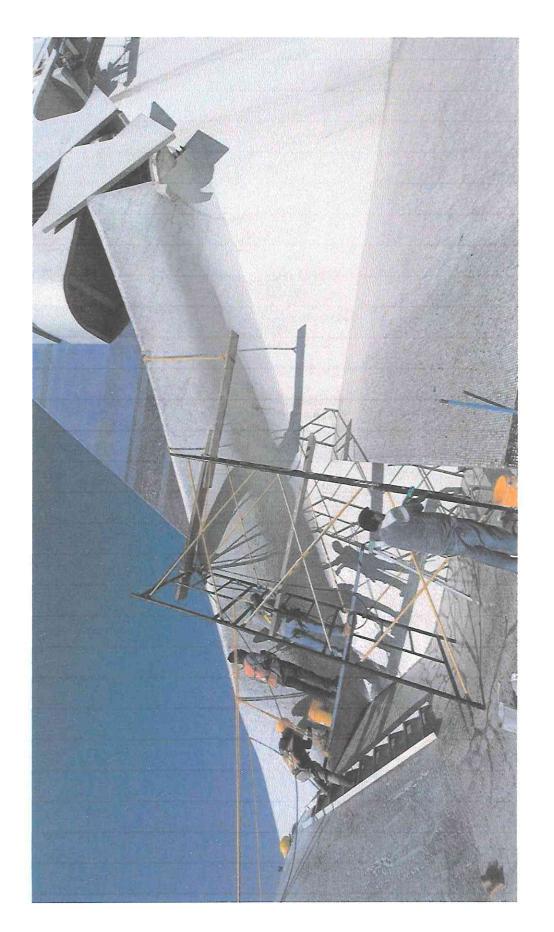

Desinfección de la tesela del sector B2.

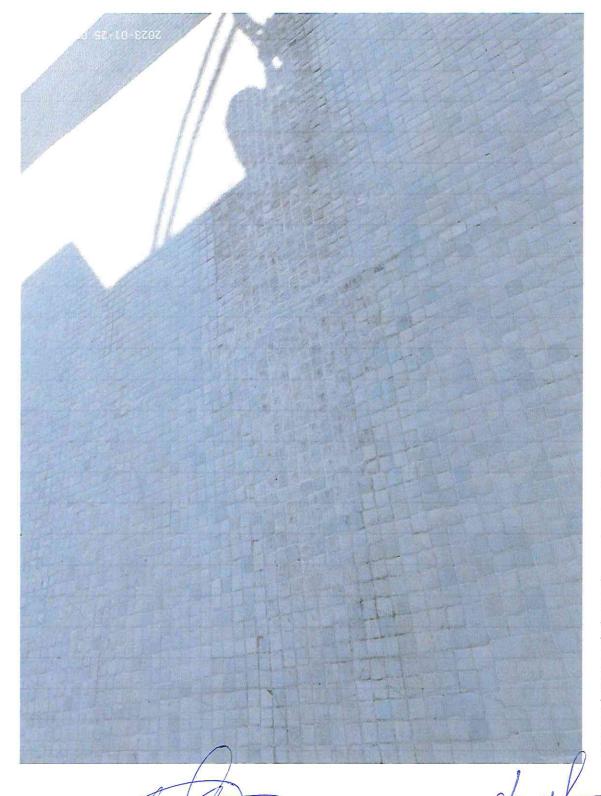

Primera limpieza de la tesela en el sector B2.

priede Departamento Sustantivo II en Funciones Centro Cultural Miguel Angel Asturias Dirección General de las Artes Ministerio de Cultura y Deportes
