Licenciada
Aura Marina Gómez Mazate
Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciada Aura Marina Gómez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el acta No. CCMAA-DGA-019-2023.

Actividades realizadas:

- a. Se apoyó en los trabajos de limpieza del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- b. Se apoyó en los trabajos de desinfección del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- c. Se apoyó en los trabajos de liberación de agregados del segmento que se le fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- d. Otras actividades afines a su contrato.

Resultados Obtenidos:

- En los días del 01 al 10 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de limpieza del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - Como parte de dichos trabajos se utilizó herramientas de limpieza como cepillos metálicos para la remoción primaria superficial de elementos contaminantes, en la que se eliminaron partículas de polvo, residuos orgánicos e inorgánicos que puedan estar impregnados en la superficie.

- En los días del 13 al 17 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de desinfección del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - o Para poder realizar dichos trabajos se utilizó aspersores, brochas, cepillos con cerdas de plástico y cepillos con cerdas metálicas para hacer un tallado a profundidad, además de material químico diluido, tales como anti sarro, ácido muriático y ácido oxálico para eliminar todo el material orgánico e inorgánico que se ha impregnado en las superficies de manera profunda y las cuales se desinfectaron. Para realizar dicho trabajo se dio uso al equipo de seguridad industrial implementado para dichas labores, dentro del cual se encuentran gafas protectoras, casco, respirador con filtro, guante para manejo de químicos, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.
- En los días del 20 al 28 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de liberación de agregados del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Angel Asturias.
 - Para esta fase se utilizaron cinceles, martillos y pulidoras para lograr retirar los materiales de acabados como teselas dañadas, cernido, repello y mortero de pega utilizado para la adherencia de las mismas. Dentro del equipo de seguridad industrial se utilizó guantes protectores, gafas protectoras, casco, mascarillas o respirador, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida

Jhony Alexis Reves Urízar

Vo. Bo

ra Marina Gómez Mazate artamento Sustantivo II en Funciones Cultural Miguel Angel Asturias Dirección General de las Artes

Ministerio de Cultura y Deportes

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PRODUCTO DEL AÑO 2023 PRODUCTO

Nombre: Jhony Alexis Reyes Urízar Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias Dependencia:


Producto a Entregar: Único producto

						Ш	PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	ODE	≣L 01	1 AL	28 D	正世	EBR	RO	OEL	ANO	202	23			
											FEB	FEBRERO	02								
ACTIVIDADES	10	02	03	90	20	80	60	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	
En los días del 01 al 10 de febrero																					
se iniciaron a realizar los trabajos																					
fachada oriente del provecto de	9		100										-								
revitalización, remozamiento v	×	×	×	×	×	×	×	×													
restauración de las fachadas					-		-						****								
oriente y poniente del Centro	534															_					
Cultural Miguel Ángel Asturias.						æå.															
En los días del 13 al 17 de febrero																					
se iniciaron a realizar los trabajos												-									
de desinfección del segmento A1																					
de la fachada oriente del proyecto									>	>	>	×	>	-		_					
de revitalización, remozamiento y					-				<	<	<	•	<								
restauración de las fachadas					-						_										•
e del Centro					-						_		-								
Cultural Miguel Ángel Asturias.												-									
En los días del 20 al 28 de febrero																					
se iniciaron a realizar los trabajos																					
de liberación de agregados del					-11-12-																
segmento A1 de la fachada oriente					-			===						×		_					
del proyecto de revitalización,													-		×	×	×	×	×	×	
remozamiento y restauración de												-									
las fachadas oriente y poniente del																_					
Centro Cultural Miguel Ángel											-										
																			-	-	

Vo. Bo

Jefe de Departamento Susiantivo II en Funciones Centro Cultural Miguol Angel Asturias Dirección General de las Artes Ministerio de Cultura y Deportes Licda, Aura Marina Gómez Mazate


Jhony Alexis Reyes Urízar

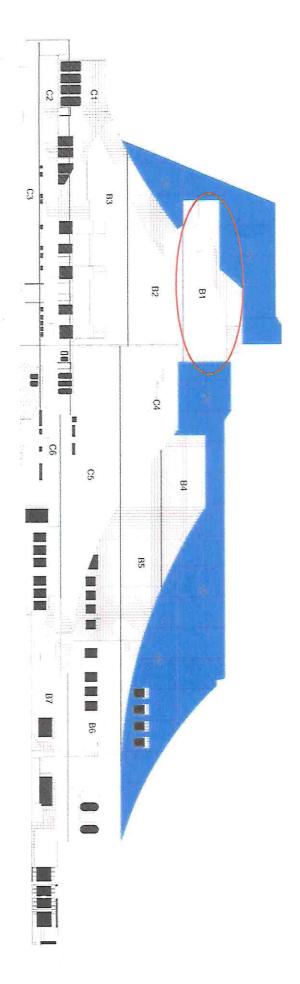

Esquema de ubicación de sectores de la fachada oriente. En el lado izquierdo en un círculo rojo se ubica el sector B1.




Esquema de desinfección y liberación de agregados del balcón en el sector B1.

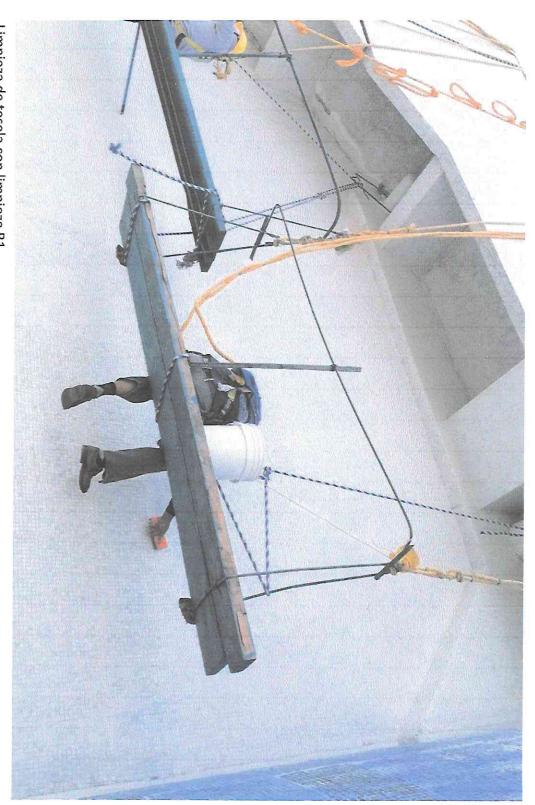

Limpieza de tesela con limpieza B1.

ž.



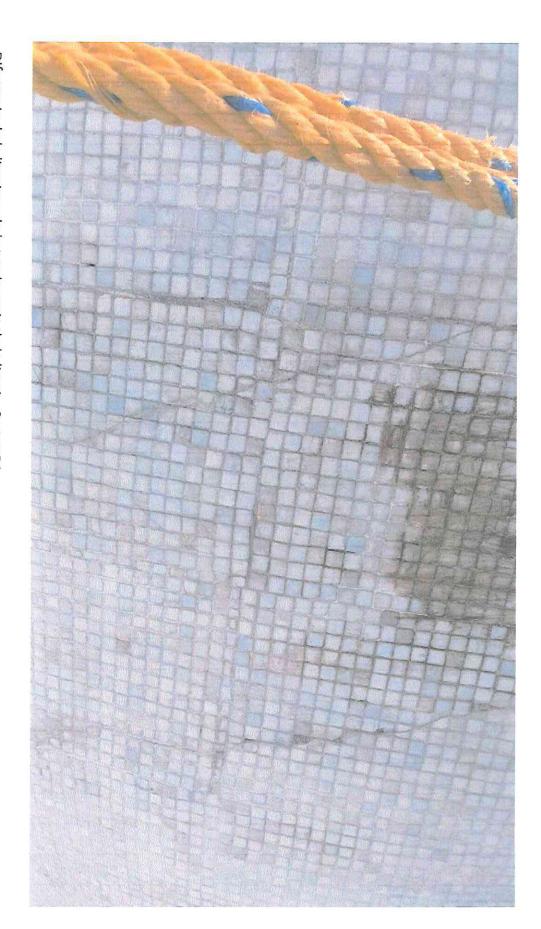

Diferencia de la limpieza de la tesela sucia de la limpia. Sector B1.

Contro Cultural Miguel Gomez Mazate
Contro Cultural Miguel Angel Asturias
Dirección Genoral de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
