Licenciada
Aura Marina Gómez Mazate
Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciada Gómez Mazate:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el acta No. CCMAA-DGA-045-2023.

Actividades realizadas:

- a. Se apoyó en los trabajos de limpieza del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- b. Se apoyó en los trabajos de desinfección del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- c. Se apoyó en los trabajos de liberación de agregados del segmento que se le fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- Otras actividades afines a su contrato.

Resultados Obtenidos:

- En los días del 01 al 10 de febrero se inició con los trabajos de limpieza del segmento TC de la fachada poniente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - Como parte de dichos trabajos se utilizó herramientas de limpieza como cepillos metálicos para la remoción primaria superficial de elementos contaminantes, en la que se eliminaron partículas de polvo, residuos orgánicos e inorgánicos que puedan estar impregnados en la superficie.

- En los días del 13 al 17 de febrero se inició con los trabajos de desinfección del segmento TC de la fachada poniente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - Para poder realizar dichos trabajos se utilizó aspersores, brochas, cepillos con cerdas de plástico y cepillos con cerdas metálicas para hacer un tallado a profundidad, además de material químico diluido, tales como anti sarro, ácido muriático y ácido oxálico para eliminar todo el material orgánico e inorgánico que se ha impregnado en las superficies de manera profunda y las cuales se desinfectaron. Para realizar dicho trabajo se dio uso al equipo de seguridad industrial implementado para dichas labores, dentro del cual se encuentran gafas protectoras, casco, respirador con filtro, guante para manejo de químicos, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.
- En los días del 20 al 28 de febrero se inició con los trabajos de liberación de agregados segmento TC de la fachada poniente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - Para esta fase se utilizaron cinceles, martillos y pulidoras para lograr retirar los materiales de acabados como teselas dañadas, cernido, repello y mortero de pega utilizado para la adherencia de las mismas. Dentro del equipo de seguridad industrial se utilizó guantes protectores, gafas protectoras, casco, mascarillas o respirador, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.

or Vidael Corado Revolorio

Ticda. Aura Marina Gómez Mazate

Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones Centro Cultural Miguel Angel Asturias Dirección General de las Artes Ministerio de Cultura y Doportes

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PRODUCTO

PRODUCTO DEL AÑO 2023

Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias Dependencia:

Nombre: Hector Vidael Corado Revolorio

Producto a Entregar: Único producto


						PE	PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	0 D	EL 0	1 AL	28	一旦	EBR	ERO		AÑ	20%	23			
											盟	FEBRERO	20								
ACTIVIDADES	10	02	03	90	20	80	60	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	
En los días del 01 al 10 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de limpieza del segmento TC de																					
la fachada poniente del proyecto de revitalización, remozamiento y	×	×	×	×	×	×	×	×													
restauración de las fachadas																					
oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.											<u> </u>										
En los días del 13 al 17 de febrero											T	-	T								
se iniciaron a realizar los trabajos																					
de desinfección del segmento TC																					
proyecto de revitalización.									×	×	×	×	>				180-01				
o y re									:	:	•	<									
las fachadas oriente y poniente del										-											
Centro Cultural Miguel Angel Asturias.																					
En los días del 20 al 28 de febrero												-		T							
se iniciaron a realizar los trabajos																		00167			
de liberación de agregados del																					
segmento TC de la fachada																					
poniente del proyecto de														×	×	×	×	×	×	×	
revitalización, remozamiento y								32.											ni Si		
restauración de las fachadas		-																			
oriente y poniente del Centro																					
Cuitul al Miguel Angel Asturias.												-									

Vo. Bo


Hestor Vidael Corado Revolorio

Libeta. Tura Marina Gómez Mazate


Centro Cultural Miguel Angel Asturias Dirección General de las Artes Inisterio de Cultura y Deportes Jefe de Depertemento Sustantivo II en Funciones

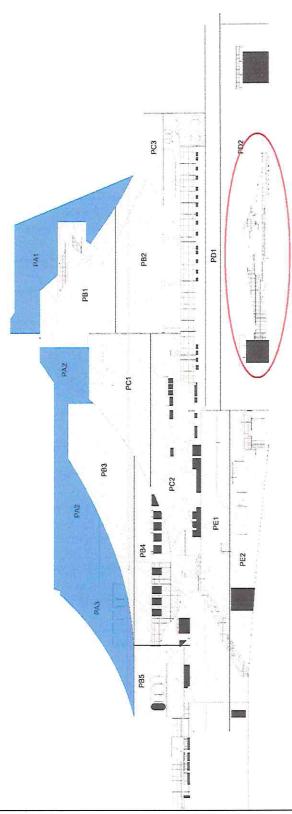


ESQUEMA DE UBICACIÓN DE SECTORES DE LA FACHADA PONIENTE. EN CIRCULO ROJO EL SEGMENTO TC.

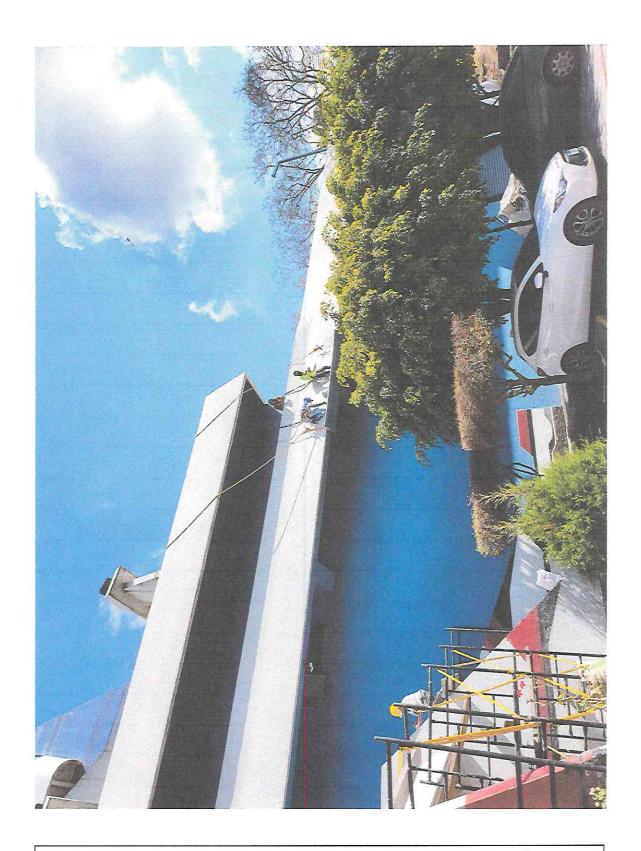

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LIBERACIÓN DE AGREGADOS EN INGRESO DEL TEATRO DE CÁMARA – SEGMENTO TC

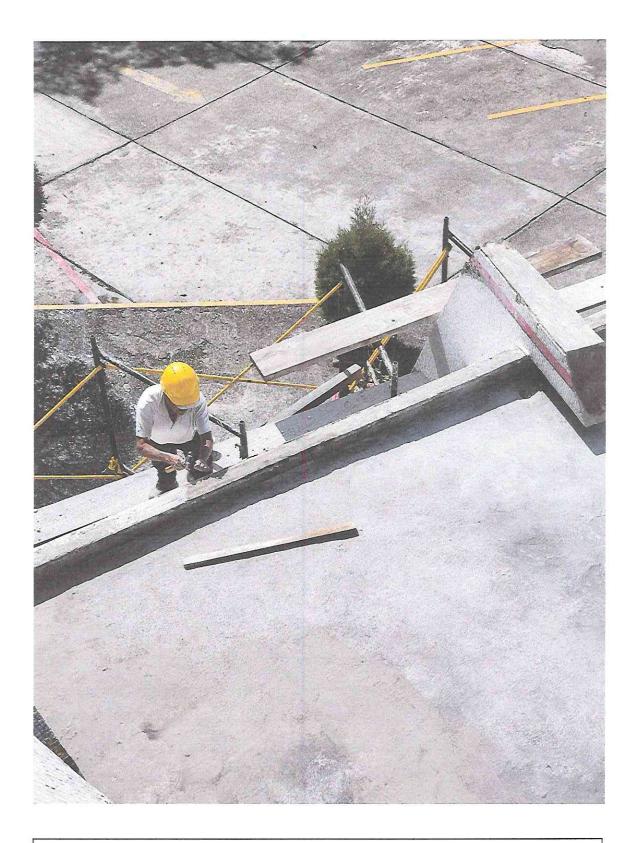

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y LIBERACIÓN DE AGREGADOS EN PARTE SUPERIOR DEL INGRESO DEL TEATRO DE CÁMARA – SEGMENTO TC

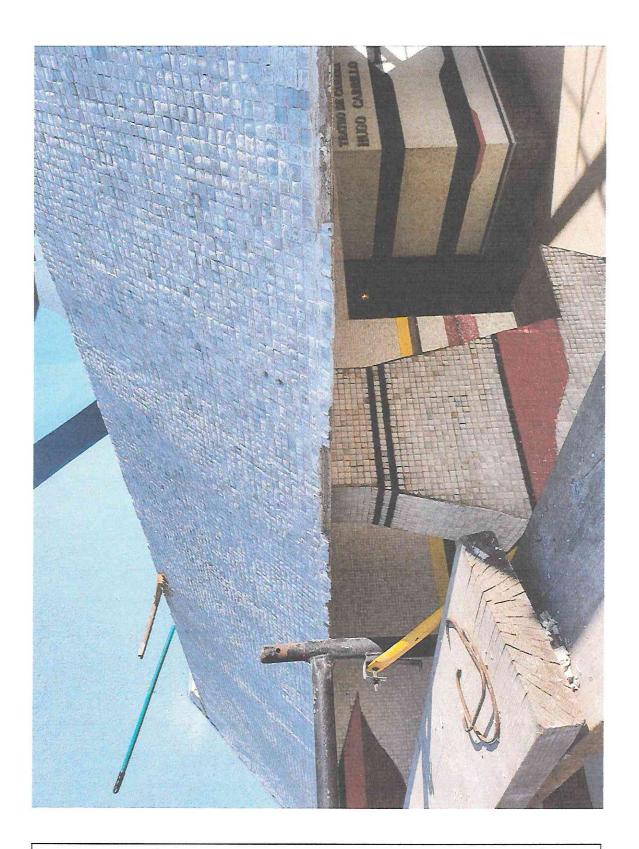

TRABAJOS LIBERACIÓN DE AGREGADOS EN PARTE SUPERIOR DEL INGRESO DEL TEATRO DE CÁMARA – SEGMENTO TC

Sicha, Terra Marthu Gyma Muzate

Joseph Garans Suszah Chan Frances
Corre Contral Manual Contral de las Artes

Linix Contral de las Artes
