Licenciada
Aura Marina Gómez Mazate
Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

## Licenciada Gómez Mazate:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el acta No. CCMAA-DGA-051-2023.

### Actividades realizadas:

- a. Se apoyó en los trabajos de limpieza del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- b. Se apoyó en los trabajos de desinfección del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- c. Se apoyó en los trabajos de liberación de agregados del segmento que se le fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- d. Otras actividades afines a su contrato.

# Resultados Obtenidos:

- En los días del 01 al 10 de febrero se inició con los trabajos de limpieza del segmento PA3 de la fachada poniente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
  - Como parte de dichos trabajos se utilizó herramientas de limpieza como cepillos metálicos para la remoción primaria superficial de elementos contaminantes, en la que se eliminaron partículas de polvo, residuos orgánicos e inorgánicos que puedan estar impregnados en la superficie.

- En los días del 13 al 17 de febrero se inició con los trabajos de desinfección del segmento PA3 de la fachada poniente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
  - Para poder realizar dichos trabajos se utilizó aspersores, brochas, cepillos con cerdas de plástico y cepillos con cerdas metálicas para hacer un tallado a profundidad, además de material químico diluido, tales como anti sarro, ácido muriático y ácido oxálico para eliminar todo el material orgánico e inorgánico que se ha impregnado en las superficies de manera profunda y las cuales se desinfectaron. Para realizar dicho trabajo se dio uso al equipo de seguridad industrial implementado para dichas labores, dentro del cual se encuentran gafas protectoras, casco, respirador con filtro, guante para manejo de químicos, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.
- En los días del 20 al 28 de febrero se inició con los trabajos de liberación de agregados segmento PA3 de la fachada poniente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
  - Para esta fase se utilizaron cinceles, martillos y pulidoras para lograr retirar los materiales de acabados como teselas dañadas, cernido, repello y mortero de pega utilizado para la adherencia de las mismas.
     Dentro del equipo de seguridad industrial se utilizó guantes protectores, gafas protectoras, casco, mascarillas o respirador, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.

Fredy Stivens Taquez Yucuté

V U. L

Licda. Rura Marina Gómez Mazate

Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones Centro Cultural Miguel Angel Asturias Dirección General de las Artes Ministerio de Cultura y Departes

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PRODUCTO

PRODUCTO DEL AÑO 2023

Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias Dependencia:

Producto a Entregar: Único producto


Nombre: Fredy Stivens Taquez Yucuté

						PE	PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	00 D	EL 0	1 AL	28 [	NE F	EBR	ERO	DEL	AÑ	0 20	23				
											FE	FEBRERO	RO									
ACTIVIDADES	10	02	03	90	20	80	60	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28		Q <sub>TH</sub> 2
En los días del 01 al 10 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de limpieza del segmento PA3 de																						1
la fachada poniente del proyecto de revitalización, remozamiento y	×	×	×	×	×	×	×	×														
restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro																						
Cultural Miguel Ángel Asturias.																						
En los días del 13 al 17 de febrero																						Γ
se iniciaron a realizar los trabajos																						-
esinfección del segmento l												75-2										-
nada						-				0	0		93									
proyecto de revitalizacion,									×	×	×	×	×									
remozamiento y restauración de																						
las fachadas oriente y poniențe del																						
Centro Cultural Miguel Angel																						
Asturias.																						
En los días del 20 al 28 de febrero																						
se iniciaron a realizar los trabajos																						
de liberación de agregados del						-																
segmento PA3 de la fachada						-																
poniente del proyecto de		7-1111												×	×	×	×	×	×	×		
revitalización, remozamiento y											10			ý	j	K.	S .					-
restauración de las fachadas												-										
oriente y poniente del Centro												S-31										
Cultural Miguel Ángel Asturias.																		1	6			0.1111


Jole de Departamento Sustantivo II en Funciones Contro Gultural Migual Angel Asturias Dirección Genoral de las Artes Ministerio de Cultura y Deportes Licda. Aura Marina Gómez Mazsase

Fredy Stivens Taquez Yucuté


# 

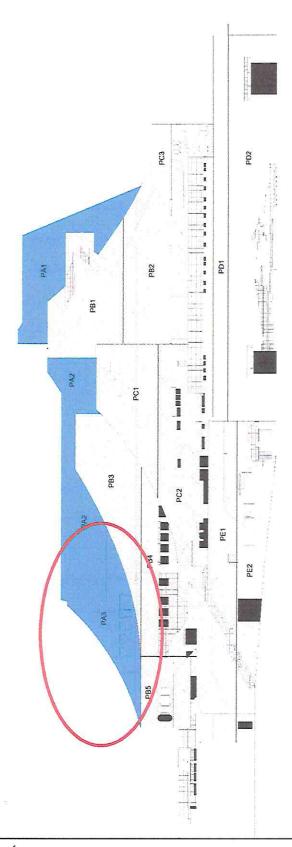

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TESELA DE TONALIDADES COLOR AZUL – SEGMENTO PA2, ARMADO DE ANDAMIOS PARA PARTE SUPERIOR

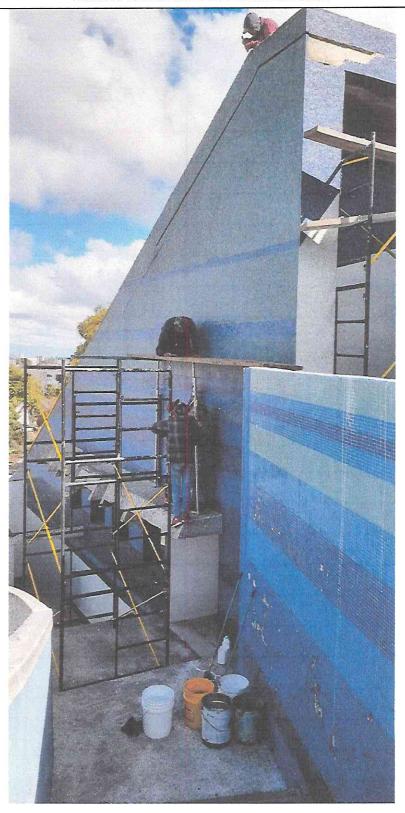

TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VIDRIO DE VENTANAS Y CORNISA – SEGMENTO PA2.

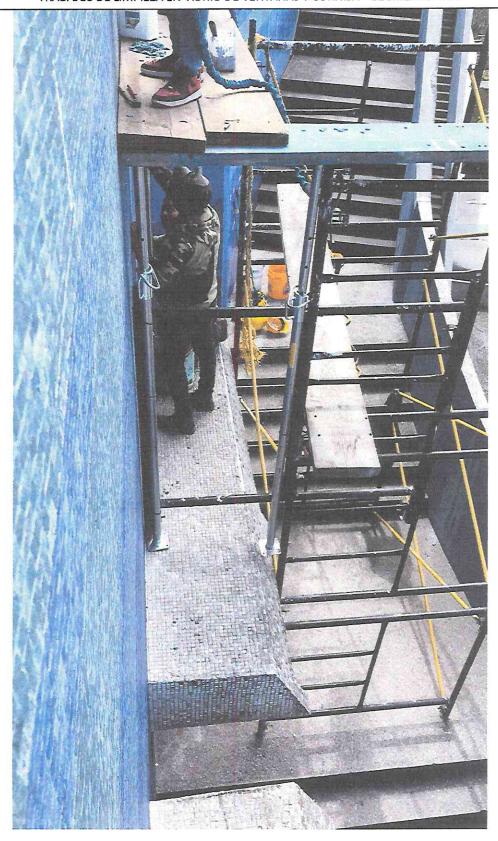

# TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VIDRIO DE VENTANAS Y CORNISA – SEGMENTO PA3.



Sicola, Aura Marina Gómez Mazate

Mole de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Salvura Mixuel Angel Asturia:
Disascor Especial y Deportes

Lend Ser
