Licenciada
Aura Marina Gómez Mazate
Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

## Licenciada Gómez Mazate:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el acta No. CCMAA-DGA-059-2023.

### Actividades realizadas:

- a. Se apoyó en los trabajos de limpieza del segmento que se me fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- b. Se apoyó en los trabajos de desinfección del segmento que se me fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- c. Apoyé en los trabajos de liberación de agregados del segmento que se me fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- d. Otras actividades afines a su contrato.

## Resultados Obtenidos:

- En los días del 01 al 10 de febrero se inició con los trabajos de limpieza del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
  - Como parte de dichos trabajos se utilizó herramientas de limpieza como cepillos metálicos para la remoción primaria superficial de elementos contaminantes, en la que se eliminaron partículas de polvo, residuos orgánicos e inorgánicos que puedan estar impregnados en la superficie.
- En los días del 13 al 17 de febrero se inició con los trabajos de desinfección del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización,

remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

- o Para poder realizar dichos trabajos se utilizó aspersores, brochas. cepillos con cerdas de plástico y cepillos con cerdas metálicas para hacer un tallado a profundidad, además de material químico diluido, tales como anti sarro, ácido muriático y ácido oxálico para eliminar todo el material orgánico e inorgánico que se ha impregnado en las superficies de manera profunda y las cuales se desinfectaron. Para realizar dicho trabajo se dio uso al equipo de seguridad industrial implementado para dichas labores, dentro del cual se encuentran gafas protectoras, casco, respirador con filtro, quante para manejo de químicos, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.
- En los días del 20 al 28 de febrero se inició con los trabajos de liberación de agregados del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
  - Para esta fase se utilizaron cinceles, martillos y pulidoras para lograr retirar los materiales de acabados como teselas dañadas, cernido, repello y mortero de pega utilizado para la adherencia de las mismas. Dentro del equipo de seguridad industrial se utilizó guantes protectores, gafas protectoras, casco, mascarillas o respirador, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.

Antonio Hernández Jocó

Vo. Bo

Bura Marina Gómez Mazate de Departamento Sucianitivo II en Funciones antro Cultural Miguel Angal Asturias Dirección General de las Artes Dirección General de las Artes Ministerio de Cultura y Depertes

## **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES** CORRESPONDIENTE AL ÚNICO PRODUCTO

PRODUCTO DEL AÑO 2023

Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias Producto a Entregar: Único producto Dependencia:

Nombre: Antonio Hemández Jocón

28 × 27 × 24 × PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 23 × 22 × 21 × 20 × FEBRERO 1 × 16 × 15 × 14 × 5 × 9 × 60 × 90 × 07 × 90 × 03 × 02 × 5 × se iniciaron a realizar los trabajos de limpieza del segmento A1 de la revitalización, remozamiento y se iniciaron a realizar los trabajos de desinfección del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto fachada oriente del proyecto de de las fachadas oriente y poniente del Centro En los días del 13 al 17 de febrero de revitalización, remozamiento y se iniciaron a realizar los trabajos de liberación de agregados del En los días del 01 al 10 de febrero fachadas oriente y poniente del Centro En los días del 20 al 28 de febrero segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Miguel Angel Cultural Miguel Ángel Asturias. Cultural Miguel Angel Asturias. ACTIVIDADES restauración de las Centro Cultural restauración Asturias.


Elcda, Rura Marina Gómez Mazate

Centro Cultural Miguel Angel Asturias Jefe de Departemento Sustantivo II en Funciones Ministerio de Cultura y Deportes Dirección Goneral de las Artes


ptone Herhandez Jocón

# 


Segmento A1 – Fachada Oriente

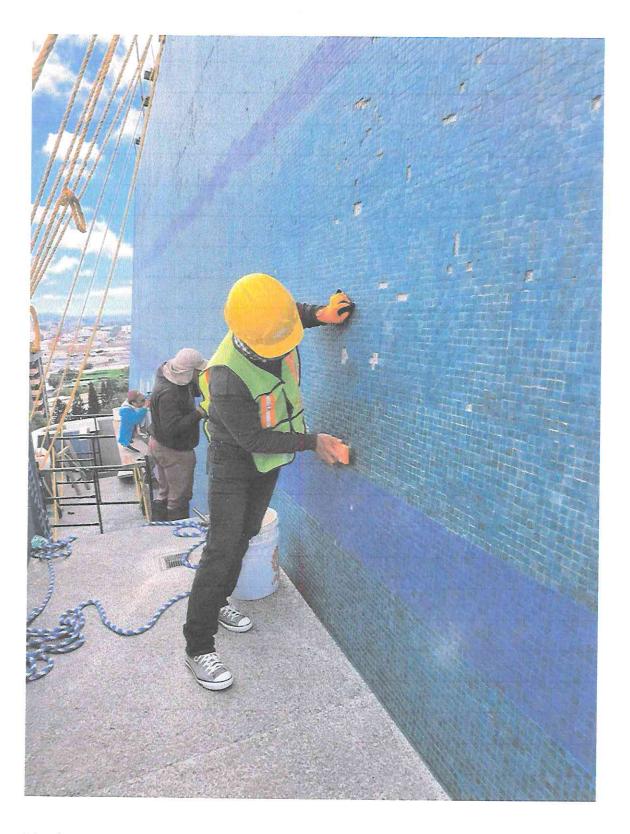

Limpieza y desinfección en tesela color verde y azul en segmento A1.

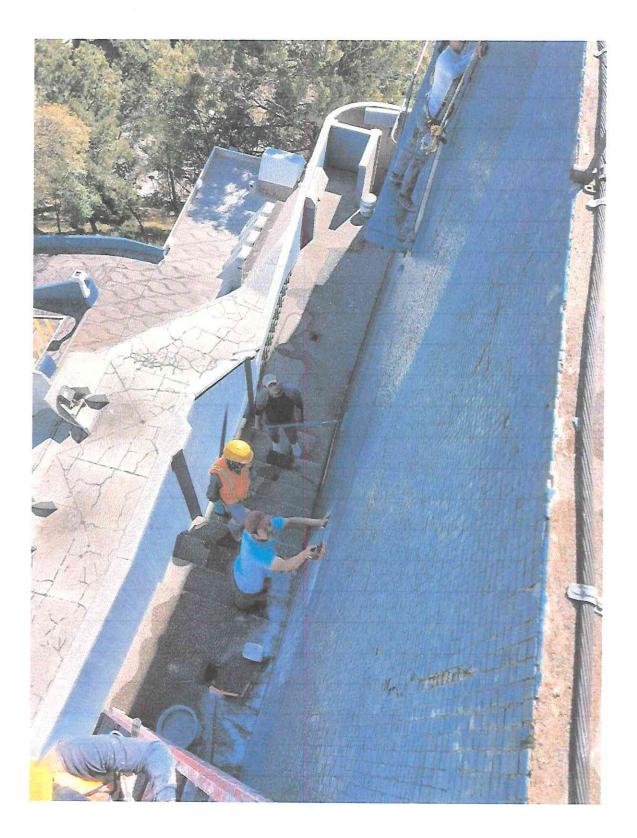

Limpieza y desinfección en tesela color verde y azul en segmento A1.

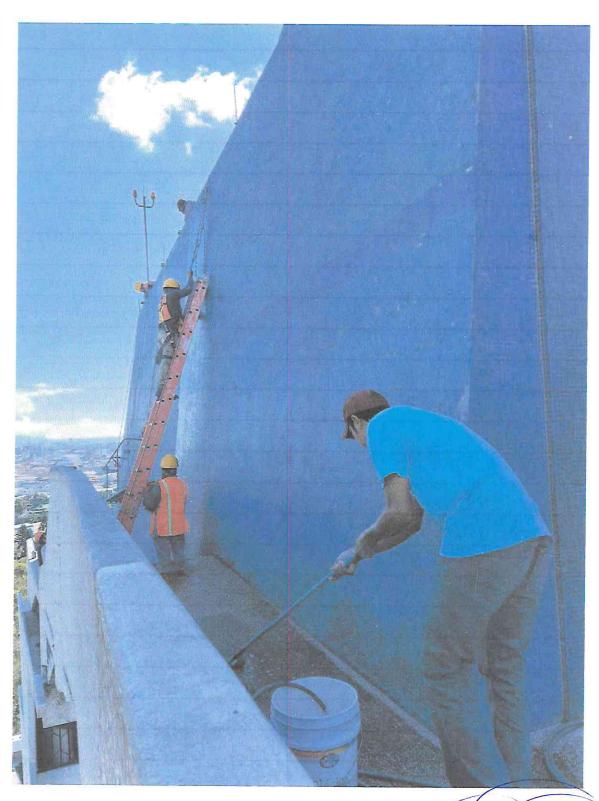

Trabajos de limpieza y desinfección en teselas y piso de grapito, en segmento A1 de fachada oriente.

A. R. M. Surianivo II en Funciones
Surianivo II en Funciones
Surio Cuito Miguel Angel Asturias
Dirección General de las Artes
Linisterio de Cultura y Deportes
