

Raúl Eduardo Noriega Girón

01 Calle 3-23 zona 2, Santa Cruz del Quiché, Quiché
FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

RAÚL EDUARDO NORIEGA GIRÓN

noriegaer@yahoo.com

NIT.: 702165-8


No. SERIE B 00026

Día: 30 Mes: Sep. Año: 2013

Nombre: Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 av 11-11 Zona 1

Nit.: 337851-9

Cantidad	Descripción	Valor
	Honorarios por servicios Técnico Profesionales en el Departamento de Conservación y Rescate de sitios Arqueológicos Prehispánicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Septiembre de 2013 según Contrato Administrativo No. 389-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013	Q. 10,000.00
		
	CANCELADO	
	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
Total en letras:	Diez mil quetzales exactos	
<small>Impresiones Beymar N.º 683671-2 - 100 Fojas, Serie B del 01 al 100 Autorizado Según Resolución N.º 2012-5-899-55 de Fecha 19-04-2012.</small>		Total Q. 10,000.00

Original: Cheque - Duplicado: Contribuyente

Guatemala, 30 de septiembre 2013.
Informe 09-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 389-2013**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **28-2013**, correspondiente **al mes de septiembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000026**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo y construcción de nueva letrina para uso del personal de apoyo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio A-5 en la Acrópolis oeste del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión de la producción de cal en la periferia del sitio arqueológico Naranjo.

Actividades emergentes

5. Supervisión en la restauración del edificio A-15 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio A-7 en el sitio arqueológico Naranjo.
7. Supervisión en fundición de pisos en los servicios sanitarios destinados al uso turístico en el área arqueológica de Naranjo.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisaron los trabajos de limpieza en cocinas, dormitorios, baños y letrinas del campamento utilizado por el personal que labora en el sitio arqueológico Naranjo y se inició con la construcción de una nueva letrina para uso del personal de apoyo, iniciando con la construcción de un foso de 3.00 x 4.00 m y una profundidad de 3.00m.
2. Se supervisó el mantenimiento (limpieza y control de vegetación) en aproximadamente 7 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo, así como la limpieza permanente de los muros en los edificios ya restaurados.

Calzada a la acrópolis del Norte




3. En el Edificio A-5 de la Acrópolis Oeste en el sitio arqueológico Naranjo se supervisó la restauración de 28 m² de restauración en el muro sur y esquina sureste. En el muro sur se consolidó la sillería existente mediante la reposición de sisas mientras que en la esquina sureste se trabajó en la recuperación de volumen en la base.

Esquina sureste del edificio A-5



4. En la periferia al sitio arqueológico Naranjo se supervisó el armado y quema de piedra en el horno construido con este fin, el total de la producción fue de 28 toneles de cal en terrón equivalente a los 49 toneles de cal en pasta.

Proceso de apagado de la piedra en pilas de agua

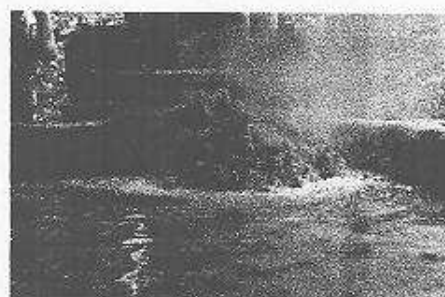

Actividades Emergentes

5. En el edificio A-15 del sitio arqueológico Naranjo se superviso el trabajo de restauración en las fachadas norte y oeste del edificio, se trabajaron 21 metros cuadrados de muros en los cuales fue necesario cambiar un porcentaje muy alto de su sillería original por encontrarse en mal estado de conservación, sillería fragmentada y que se pulveriza fácilmente.

Esquina noroeste del edificio A-15




6. En el edificio A-7 de la Acrópolis Oeste se superviso el trabajo de restauración realizado en 26 m² de muros, distribuidos entre la esquina sureste del basamento y las bancas en el interior del templo; la actividad consistió esencialmente en la recuperación de volúmenes en el núcleo y la estabilización de sillería para lo cual fue necesario desmontar parte de esta y resanar sisas.



Fachada sur del edificio A-7

7. Se superviso la colocación de duelas en el área para retretes y la fundición de una torta de cemento con duelas de madera en el área para lavamanos, en total se trabajaron 12 m². de piso.

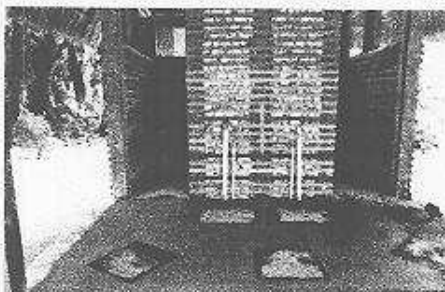

Proceso de la fundición de piso en baños de Naranjo

Edin Robel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
C.c. Administración DECORSIAP. Archivo.
Departamento de Estudios Arqueológicos Prehispánicos
INAH-COPEC

Raúl Eduardo Noriega Girón
