

Guatemala, 27 de junio 2014.
Informe 06-2014

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 197-2014**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **27-2014**, correspondiente al **mes de junio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000038**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración en el edificio B-24 de naranjo.
4. Se superviso la quema de piedra para la producción de cal.

Actividades emergentes.

5. Supervisión en la restauración del edificio B-18 de Naranjo.
6. Supervisión de los trabajos previos a la restauración del edificio 137 de Yaxha.
7. Supervisión de infraestructura en el área arqueológica.

Resultados Obtenidos:


1. Se supervisó el mantenimiento de la infraestructura existente en el campamento para el personal y técnicos en el sitio arqueológico Naranjo, reparando la cubierta de uno de los ranchos en el área de manejo de cerámica para lo cual se utilizaron 400 palmas de guano.
2. Se mantuvo una actividad constante de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 6 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.

Trabajos de control de vegetación en el juego de pelota mayor



3. Se supervisó los trabajos en la construcción de la torre de andamios en la esquina noroeste del edificio B-24, concluyendo con la misma con una altura de 22 metros desde el piso de plaza.

Andamiaje en la esquina noroeste del edificio B-24

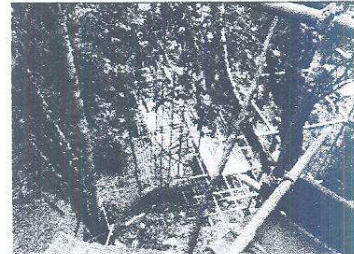

Se supervisó el trabajo de cantera para el corte de piedra de muro que se utilizara en la restauración de los relieves a restaurar en el edificio B-18 de donde cada bloque de piedra debe de medir 0.25 X 0.30 X 1.30 m. como medida promedio.

4. Se supervisó el armado del horno para la quema de piedra como proceso para la producción de cal en el horno que se encuentra en la periferia del área monumental de la ciudad de Naranjo en donde se produjo el equivalente a 54 toneles de cal en pasta.

Actividades emergentes

5. Se supervisó los trabajos de conservación en el edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo, en donde se desmontó relleno constructivo por encontrarse conformado por material suelto, en áreas donde se localizó la existencia de grietas tanto en sentido este oeste como norte sur. Se sellaron las grietas pequeñas (no mayores de 0.05m. de ancho) con lechadas de mezcla hecha a base de cal e inicio con la reposición del volumen removido utilizando piedra laja y mezcla.

Trabajos de reposición de volumen en el núcleo de los muros




Edificio 137, fachada norte primer cuerpo.



7. Se superviso la construcción del graderío hecho en la fachada norte del edificio B-24 con la intención de facilitar el acceso al personal que labora en la plataforma superior de la pirámide, el graderío tiene una longitud de 50m. y una altura de aproximadamente 22 metros.

Edificio B-24 en Naranjo, construcción de escalinata en fachada norte

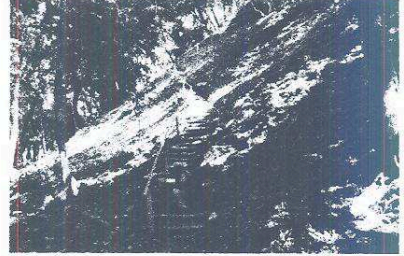


Edin Róbel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAH-DGPCN


Raúl Eduardo Noriega Girón
