

Guatemala, 27 de febrero 2015.
Informe 02-2015

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2015**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **16-2015**, correspondiente al mes de **febrero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000053**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio B-18 de naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio 237 en Yaxha

Resultados Obtenidos:



1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo, cuya área es la equivalente a 1 Ha.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 3 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrándose el trabajo la parte este la ciudad.

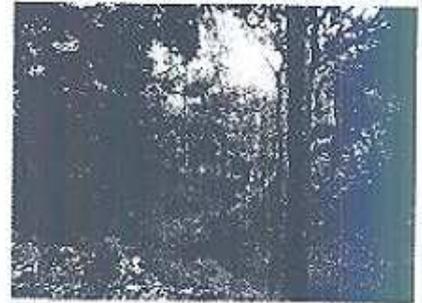

3. Se supervisó los trabajos realizados en el lado oeste del edificio B-18, en donde se realizan trabajos de limpieza de escombros proveniente del deslizamiento de tierra provocado por la sobresaturación de agua en el material acumulado en la pirámide del edificio. El área afectada se estima en 127 m².



4. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las actividades siguientes: traslado de piedra laja recolectada en la periferia del área arqueológica al punto de trabajo, corte de piedra de cantera para restituir los sillares que se desmontaron, se completó el desmontaje de los sillares tallados en el muro del primer cuerpo del lado norte y se restauró 27.00 m² de muro.



Elin Robel Hernández Páez
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
INAH-DECCN

C.c. Administración DECORSIAP, Archivo.



Raúl Eduardo Noriega Girón
