

Guatemala, 31 de marzo de 2015
Informe No 03-2015


Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Vice-Ministro del Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Cultura y Deportes

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de **presentarle mi Informe de las Actividades Mensuales, conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales No 41-2015 y Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No 17-2015, correspondiente al mes de marzo del presente año**, y para cobro de mis honorarios, estoy presentando la **Factura Serie A y Correlativo No 0010**:

Actividades Realizadas:

1. Inicé con la planificación de los trabajos que se realizarán en la recuperación de las molduras de los parapetos ubicados en la azotea del Torreón Central, en los cuales el proceso de liberación la parte dañada de las molduras ha sido un proceso lento debido a que se tiene que estudiar las secciones que se deben liberar o solamente consolidar las partes dañadas, al finalizar el estudio se toma la decisión de liberar las secciones flojas ó únicamente consolidar los daños menores:
 - a. Proceso de evaluación de las piezas a trabajar en las molduras previo a su intervención, es por esto que no se puede avanzar más rápidamente en el momento de intervenir las molduras.

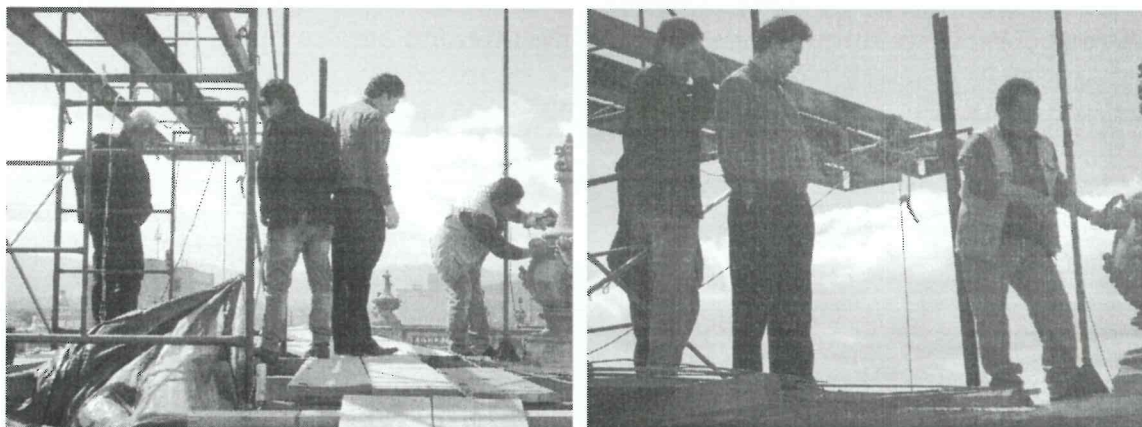



Se revisa la sección a trabajar y se evalúa para determinar Si esta parte se libera ó se consolida y luego se procede a su intervención.



Se procede a limpiar el área a intervenir de microflora, líquenes y suciedad del ambiente.



Momentos de la intervención y respectiva liberación de las áreas que necesitan ser trabajadas.



Áreas en las que ya se inició la intervención para restaurar el repello y cernido de los parapetos que rodean la azotea del Torreón Central

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas órdenes,

MARIO ROLANDO QUEXEL CHIQUITÓ

Vo. Bo.

Lic. Luis Garcia
SUB-ADMINISTRADOR DEL PALACIO NACIONAL
