

Guatemala, 31 de marzo 2015.  
Informe 03-2015

Arquitecto  
Juan Pablo Rosales Tinoco  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Arquitecto.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2015**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **16-2015**, correspondiente al mes de **marzo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000054**.

**Actividades Realizadas:**

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio 237 del sitio Yaxha arqueológico Yaxha.

## Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo, cuya área es la equivalente a 1 Ha.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 4 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrándose el trabajo la parte este la ciudad.

3. Se supervisó los trabajos realizados en el lado oeste del edificio B-18, en donde se realizan trabajos de restauración en las gradas que quedaron expuestas al remover el material suelto que se encontraba en el área del deslizamiento, se trabajaron 24 m<sup>2</sup>. entre escalones y el muro exterior del último cuerpo de la base piramidal.



4. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se inició la actividad de restauración con la remoción de escombros sobre los muros en la esquina noroeste y parte del oeste de la escalinata. Durante el plan se trabajaron 18 m<sup>2</sup> de muros.




5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se trabajó la estabilización del talud en la esquina noroeste del último cuerpo de la base piramidal en donde se trabajó 24 m<sup>2</sup> de muro.



Se realizó la remoción de material suelto sobre la mitad sur del talud del último cuerpo en el lado oeste de la base piramidal, esto como una actividad previa a iniciar con la estabilización de sus elementos constructivos, se limpió un área estimada en 48 m<sup>2</sup>.



6. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las actividades siguientes: traslado de piedra laja recolectada en la periferia del área arqueológica al punto de trabajo, desmontado 27 m<sup>2</sup> de muro entre sillares tallado originales y núcleo constructivo por encontrarse en mal estado de conservación. Se recoloco nuevamente los sillares sustituyendo los que se encontraron en mal estado de conservación por nuevos y se recuperó 36 m<sup>3</sup> de volumen de núcleo desmontado, se trabajó una superficie de fachada de 32 m<sup>2</sup>.

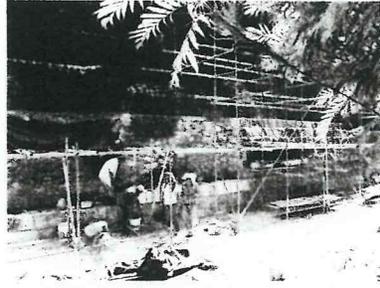

*Edin Robel Hernández Payer*  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEM-DGPCN

Raúl Eduardo Noriega Girón
