

Guatemala, 30 de abril 2015.
Informe 04-2015

Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Arquitecto.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2015**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **16-2015**, correspondiente al mes de **abril del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000055**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio 137 del sitio arqueológico Yaxha.
7. Supervisión en la producción de cal en el sitio arqueológico Naranjo y Yaxha.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo, cuya área es la equivalente a 1 Ha.

2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 6 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrándose el trabajo la parte este la ciudad.



3. Se supervisó los trabajos realizados en el lado oeste del edificio B-18, en donde se realizan trabajos de restauración en las gradas que quedaron expuestas al remover el material suelto que se encontraba en el área del deslizamiento, se trabajaron 18 m². entre escalones y el muro exterior del último cuerpo de la base piramidal.



4. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se inició la actividad de restauración con la remoción de escombros sobre los muros en la esquina noroeste y parte del oeste de la escalinata. Durante el plan se trabajaron 14 m² de muros.




5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se trabajó la estabilización del talud en la esquina noroeste del último cuerpo de la base piramidal en donde se trabajó 6 m² de muro.

Se realizó la remoción de material suelto sobre la mitad sur del talud del último cuerpo en el lado oeste de la base piramidal, esto como una actividad previa a iniciar con la estabilización de sus elementos constructivos, se limpió un área estimada en 48 m² de las cuales se estabilizó 12 m².




6. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las actividades siguientes: traslado de piedra laja recolectada en la periferia del área arqueológica al punto de trabajo; remoción de relleno suelto en el núcleo de la plataforma del primer cuerpo en esquina noreste; recuperación de volumen removido utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal, se recuperó aproximadamente 4 m³ de volumen.

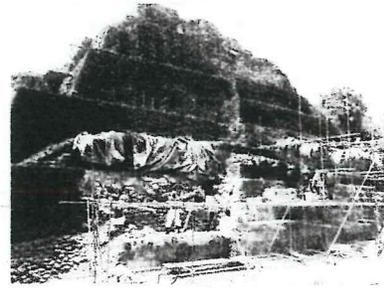

7. Se supervisó el proceso de quema de piedra para la producción de cal en pasta utilizada en los diferentes trabajos de restauración que se realizan en Naranjo de donde se obtuvo el equivalente a 46 toneles de cal en pasta. Actividad similar se realizó en Yaxha con una producción equivalente a los 39 toneles de cal en pasta.



Edin Robel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEP-DGPCN


Raúl Eduardo Noriega Girón
