

Guatemala, 29 de junio 2015.
Informe 05-2015

Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Arquitecto.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2015**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **16-2015**, correspondiente al mes de **junio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000058**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio 137 del sitio arqueológico Yaxha.

Resultados Obtenidos:


1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo, cuya área es la equivalente a 1 Ha.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 6 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrándose el trabajo la parte este la ciudad.



3. Se supervisó los trabajos realizados en el lado oeste del edificio B-18, en donde se realizan actividades de restauración a lo largo de la fachada oeste en el último cuerpo de la pirámide recuperando parte de su volumetría, consolidando el material de relleno y estabilizando lo que aún se conserva de sus sillares en la fachada. Se estabilizó 10 m² de los cuerpos.




4. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo, en donde la actividad de restauración se realiza en la fachada oeste en donde se está trabajando la recuperación de volúmenes en la escalinata así como la consolidación de los sillares que la conforman, además se removió el relleno del saqueo el cual se rellenó nuevamente utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal, se estima que se trabajó 12 m². de muros.

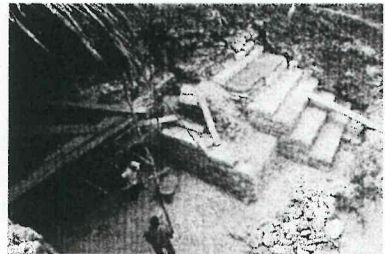


5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se trabaja en la estabilización del talud en la mitad sur del cuerpo sobre el que se apoya el mascarón en la fachada oeste, el trabajo consiste esencialmente en la remoción de la piedra y relleno suelto recuperando nuevamente su volumen utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal, se estima que se trabajó 30 m² de muro.



6. Se superviso los trabajos de restauración en el edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las actividades siguientes: traslado de piedra laja recolectada en la periferia del área arqueológica al punto de trabajo; remoción de relleno suelto en el núcleo de la plataforma del segundo cuerpo en la fachada norte y este; en donde se repuso nuevamente el relleno con un volumen que se estima en 20 m³ para ello piedra y mezcla hecha a base de cal.

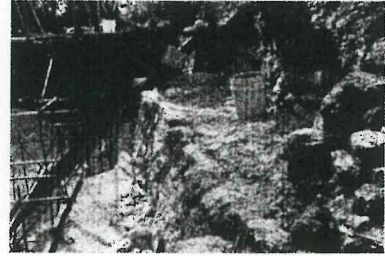


Raúl Eduardo Noriega Girón


~~Edin Roberto Amador Payes~~
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEM-DCPCN
