

Guatemala, 31 de julio 2015.
Informe 06-2015

Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Arquitecto.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2015**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **16-2015**, correspondiente al mes de **julio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000059**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio 137 del sitio arqueológico Yaxha.


Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo, cuya área es la equivalente a 1 Ha.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 4 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrándose el trabajo la parte este la ciudad.

3. Se supervisó los trabajos realizados en el lado oeste del edificio B-18, en donde se realizan actividades de restauración a lo largo de la fachada oeste en el último cuerpo de la pirámide recuperando parte de su volumetría, consolidando el material de relleno y estabilizando lo que aún se conserva de sus sillares trabajando 16 m² de fachada.




4. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo, se continúa trabajando en la fachada oeste en donde se está trabajando la recuperación de volúmenes en la escalinata así como la consolidación de los sillares que la conforman., se trabajaron 8 m². de muros.

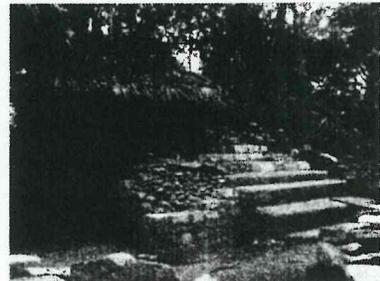


5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se trabaja en la estabilización del talud en la mitad sur del cuerpo sobre el que se apoya el mascarón en la fachada oeste, el trabajo consiste esencialmente en la remoción de la piedra y relleno suelto recuperando nuevamente su volumen utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal, se estima que se trabajó 10m² de muro.



6. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las actividades siguientes: traslado de piedra laja recolectada en la periferia del área arqueológica al punto de trabajo; remoción de relleno suelto en el núcleo de la plataforma del segundo cuerpo en la fachada norte y este; en donde se repuso nuevamente el relleno con un volumen que se estima en 16 m^3 . para ello se utilizó piedra y mezcla hecha a base de cal.

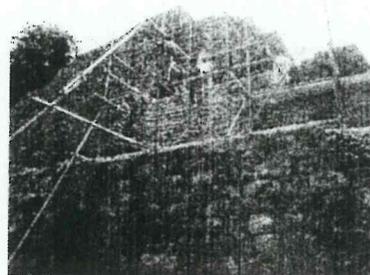


Raúl Eduardo Noriega Girón


Roberto Hernández Pajés
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEH-DCPCN
