

Guatemala, 30 de septiembre 2015.
Informe 09-2015

Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Arquitecto.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2015**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **16-2015**, correspondiente al mes de **septiembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000061**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio 137 del sitio arqueológico Yaxha.


Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo, cuya área es la equivalente a 1 Ha.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 8 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrándose el trabajo en la parte oeste la ciudad.

3. Se supervisó los trabajos realizados en el lado oeste del edificio B-18, en donde se realizan actividades de restauración a lo largo de la fachada oeste en la parte superior de la pirámide recuperando parte de su volumetría, consolidando el material de relleno y estabilizando lo que aún se conserva de sus sillares trabajando 12 m² de fachada.



4. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo, se continúa trabajando en la fachada oeste y se está trabajando en la consolidación, desmontaje y reintegración de los relieves que conforman la fachada, se trabajó una superficie estimada en 9 m².

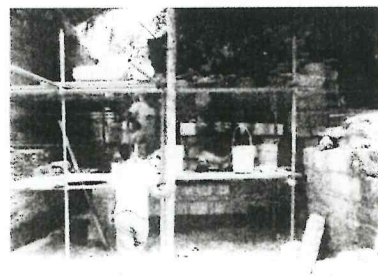

5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se trabajó en la consolidación de una porción del muro en el cuerpo de sustentación de los relieves ubicados en la parte superior del edificio, se estabilizó una superficie equivalente a los 28 m².




6. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las actividades siguientes: traslado de piedra laja recolectada en la periferia del área arqueológica al punto de trabajo; remoción de relleno suelto en el núcleo de la plataforma del tercer cuerpo esquina noreste; en donde se repuso nuevamente el volumen utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal, estimamos que el volumen trabajado es de 10 m^3 .



En el lado norte, se trabaja en la estabilización del núcleo de una parte del segundo cuerpo de la pirámide, y para ello fue necesario remover totalmente la cara superficial del área trabajada, remover la tierra y piedra suelta para posteriormente recuperar el volumen removido utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal, se trabajó 14 m^2 de fachada y un volumen equivalente a los 16 m^3 .




Edin Robel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IAEH-DGPCN


Raúl Eduardo Noriega Girón
