

Arquitecto
Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Arquitecto.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2015**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **16-2015**, correspondiente al mes de **octubre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000062**.

Actividades Realizadas:


1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio 137 del sitio arqueológico Yaxha.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo, cuya área es la equivalente a 1 Ha.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrándose el trabajo la parte este la ciudad.
3. Se supervisó los trabajos realizados en el lado oeste del edificio B-18, en donde se realizan actividades de restauración en el extremo norte recuperando parte de su volumetría en el talud y escalinata, consolidando el material de relleno y estabilizando lo que aún se conserva de los sillares originales, trabajando 16 m² de fachada.



4. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo, se continúa trabajando en la fachada oeste y se está trabajando en la consolidación, desmontaje y reintegración de los relieves que conforman la fachada, se trabajó una superficie estimada en 8 m².

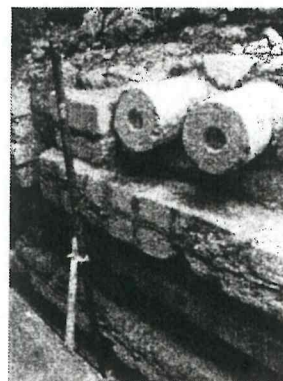

5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se trabajó en la consolidación de una porción del muro en el cuerpo de sustentación de los relieves ubicados en la parte superior del edificio, se estabilizó una superficie equivalente a los 20 m² de fachada y 22 m³ de núcleo.



6. Se superviso los trabajos de restauración en el edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las actividades siguientes: traslado de piedra laja recolectada en la periferia del área arqueológica al punto de trabajo; remoción de relleno suelto en el núcleo de la plataforma del tercer cuerpo lado norte; en donde se repuso nuevamente el volumen, utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal, estimamos que el volumen trabajado es de 18 m³ y un área estimada en 14 m².



Raúl Eduardo Noriega Girón



Edin Robel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCN

C.c. Administración DECORSIAP. Archivo.
