

Guatemala, 30 de noviembre 2015.
Informe 11-2015

Arquitecto
José Luis Menendez Ronquillo
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Arquitecto.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2015**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **16-2015**, correspondiente al mes de **noviembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000063**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio 137 del sitio arqueológico Yaxha.


Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo, cuya área es la equivalente a 1 Ha.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrándose el trabajo en el área central de la ciudad.

3. Se supervisó los trabajos realizados en el lado oeste del edificio B-18, en donde se realizan actividades de restauración en la esquina noroeste removiendo el material suelto y remonticulando el área nuevamente, además de hizo el piso con mezcla hecha a base de cal y pedrín en la parte superior de la plataforma, se fundió 23 m² de piso y se remonticula un volumen estimado en 6 m³.




4. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se continúa trabajando en las fachadas norte y oeste específicamente en la estabilización de los relieves que la conforman, desmontando y reintegrando la piedra que se encuentra en mal estado de conservación, se trabajó una superficie estimada en 8 m².



5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se fundió 36 m² de piso en la superficie del volumen reintegrado en la plataforma que sustenta los relieves que se encuentran en la parte superior del edificio.



6. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las actividades siguientes: traslado de piedra laja recolectada en la periferia del área arqueológica al punto de trabajo; remoción de relleno suelto en el núcleo de la plataforma del segundo y tercer cuerpo en la esquina noroeste; en donde se repuso nuevamente el volumen, y se consolidó las escalinatas liberadas que se encontraron por debajo del material suelto. estimamos que el volumen trabajado es de 6 m^3 y un área estimada en 28 m^2 entre escalinata y volumen de núcleo recuperado.

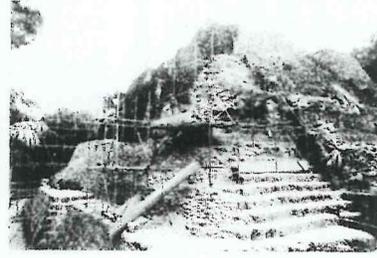

Raúl Eduardo Noriega Girón

Alexander Reyes González
COORDINADOR ADMINISTRATIVO a.i.
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH - DGPCN

C.c. Administración DECORSIAP. Archivo.
