

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 08-2016**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **24-2016**, correspondiente del **04 al 31 de enero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000067**.


Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en Naranjo.


Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 8 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, específicamente en la Plaza Central, Acrópolis Oeste, Acrópolis Central, en el extremo este de la ciudad y otras áreas que pueden ser visitadas por turistas.

3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, se trabajó en la esquina noroeste del edificio entre el tercer y cuarto cuerpo, desmontando la cascara de piedra unida con mezcla de cal y cemento hecha en la restauración de los años 2005 y 2006 sobre la cual se registraron grietas, además se removió el material suelto que se encuentra por debajo de la mencionada cascara. Se documentó gráfica y fotográficamente los vestigios arquitectónicos encontrados y se consolidaron usando mezcla hecha a base de cal iniciando la recuperación de parte del volumen removido.


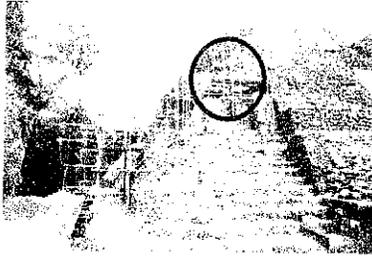


Edificio 137, esquina noroeste



Detalle del área trabajada

4. Se inició con la liberación de muro en el talud sur a 10 metros de la esquina sur oeste del cuerpo que sustenta los relieves en la parte superior de la pirámide, se removió 24 m² de material orgánico, tierra y piedra suelta, actividad previa a iniciar con la estabilización de muro.

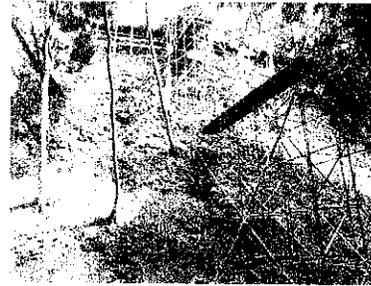

Edificio B-24, elevación sur

[Handwritten signature]

Edmundo Noriega Girón
 C.c. Administración DE CORSIAP: Archivo.
 Departamento de Construcción y Mantenimiento
 de Siles, Dirección General de Infraestructura
 del IICA

[Handwritten signature]
 Raúl Eduardo Noriega Girón
