

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2016**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **24-2016**, correspondiente al mes de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000071**.


**Actividades Realizadas:**

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en el sitio arqueológico Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.
7. Supervisión en los trabajos de conservación en el edificio de la plaza central del sitio arqueológico la Honradez.

## Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 8 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo.
3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las siguientes actividades:

- Estabilización de 20 m<sup>2</sup> de talud y relleno constructivo en el tercer cuerpo de la fachada norte.

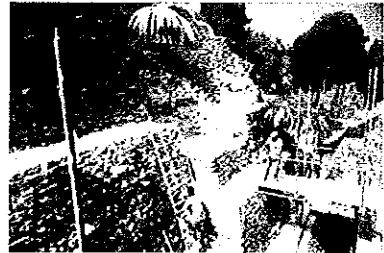


- Estabilización de 12 m<sup>3</sup> del núcleo constructivo en el cuarto cuerpo en la esquina sureste.




4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 en donde se realizaron las siguientes actividades:

- Relleno de 12 ml. de túnel ubicado en la parte superior de la pirámide y 9.5 m del pozo de investigación arqueológica ubicado en la plataforma superior del edificio.

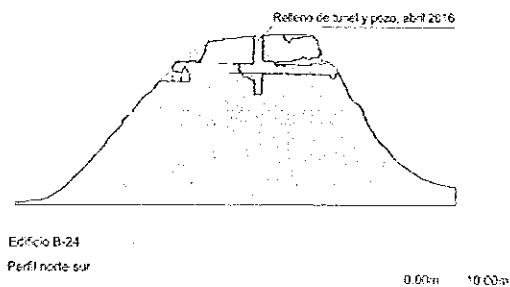

- Se estabilizó un estimado de 5 m<sup>2</sup> en el talud sur del cuerpo que sustenta los mascarones y se fundió 9 m<sup>2</sup> de piso sobre el área trabajada, en el proceso de trabajo se limpió el área removiendo raíces, material orgánico y piedra suelta recuperando el volumen de material removido utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal.

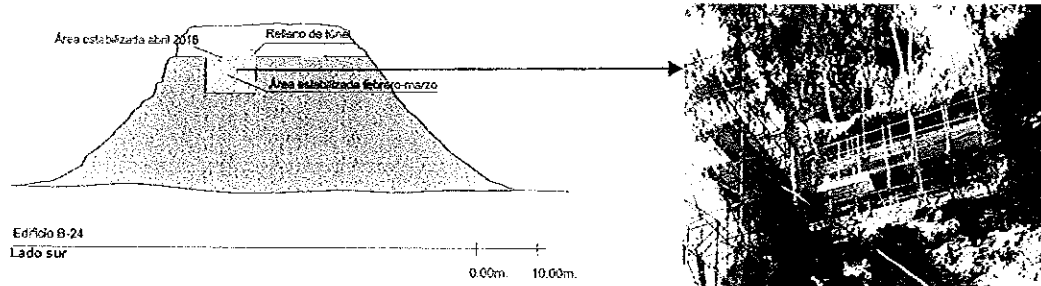

5. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio A-3 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se restauró 4 m<sup>2</sup> de muro en la fachada norte lado sur completando la reconstrucción del mascarón y en la fachada oeste al sur del bloque de las escalinatas se inició con el movimiento de material de escombros que se encontraba sobre el muro, definiendo proporciones y formas del edificio.



*Esquina sur oeste.*



*Fachada norte*

6. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo en donde se consolidaron 20 m<sup>2</sup> de escalinatas en el lado este. Para realizar esta actividad se desmontaron sillares, consolidando núcleo y recolocando nuevamente los sillares desmontados así con la sustitución de los que perdieron sus propiedades mecánicas.



7. Se supervisaron los trabajos de conservación en los edificios A-20 y A-21 en el área monumental de la ciudad, en donde se apuntalaron bóvedas y muros, además de documentar detalles de arquitectura expuesta.



*Bóveda en edificio A-20*

*Edin Robel Hernández Payes*  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-CCPCN

Raúl Eduardo Noriega Girón
