

Guatemala, 28 de febrero 2017.  
Informe 02-2017

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Número 1056-2017**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente **al mes de febrero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000088**.


**Actividades Realizadas:**

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-3 en Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en Naranjo.
7. Supervisión del registro gráfico que se realizan de los trabajos de restauración.

## Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, específicamente en la Plaza Central, Acrópolis Oeste, Acrópolis Central, en el extremo este de la ciudad y otras áreas que pueden ser visitadas por turistas.

3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se trabajó en la escalinata central en la fachada oeste a la altura de los cuerpos No. 5 y No. 6 además de los trabajos en la estabilización del sexto cuerpo entre la escalinata norte y la central. Se logró estabilizar aproximadamente 30 m<sup>2</sup> entre el muro del talud y la escalinata.

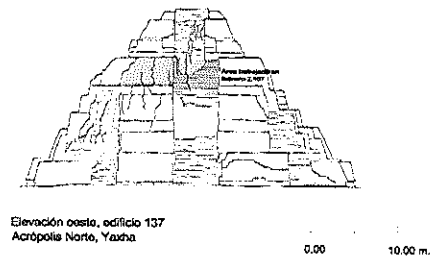


4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo en donde se completó la liberación de 55 m<sup>2</sup> de muro desde el lateral oeste del aparente límite de la escalinata hasta la esquina noroeste, además, se estabilizó 15 m<sup>2</sup> del área liberada recalzando volúmenes faltantes en el muro.




5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-3 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó la restauración de 10m<sup>2</sup> de facha reintegrando parte de la piedra de muro que se conservó.




6. Se supervisó los trabajos de restauración en el cuerpo norte superior del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo y como parte del proceso se removió 40 m<sup>2</sup> de material de escombros liberando los rasgos arquitectónicos que aún se conservan en esta parte del edificio.

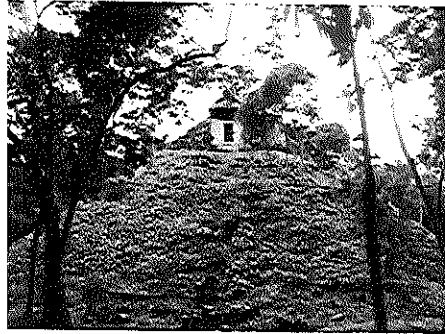

7. Se supervisó los trabajos de dibujo relacionados con la restauración de los diferentes edificios sobre los cuales se realizan trabajos, además se lleva el registro fotográfico de las actividades realizadas.

  
Raúl Eduardo Noriega Girón

  
Evelyn Lisette Samayoa Cornel  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-DGPCN
