

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 1056-2017, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 34-2017, correspondiente al mes de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura Serie B número correlativo 000091.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-3 en Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en Naranjo.
7. Supervisión del registro gráfico que se realizan de los trabajos de restauración.

Resultados Obtenidos:


1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 8 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo.

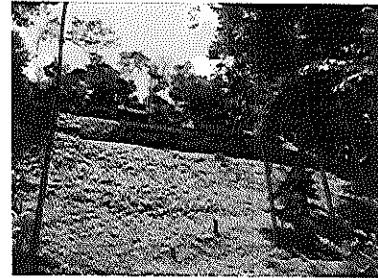


3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se trabajó en la escalinata central en la fachada oeste a la altura de los cuerpos No. 6 y No.9 en donde se hacen trabajos de remoción de material suelto preparando el área para la reintegración de los volúmenes perdidos. Se logró estabilizar aproximadamente 15 m² de su arquitectura.




4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la estabilización de 20 m² del área liberada recuperando volúmenes faltantes en el muro del talud.

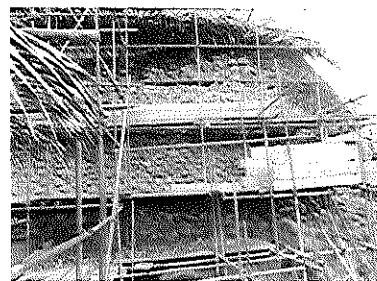

5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-3 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó la restauración de 10 m² de fachada reintegrando parte de la piedra de muro que se conservó.

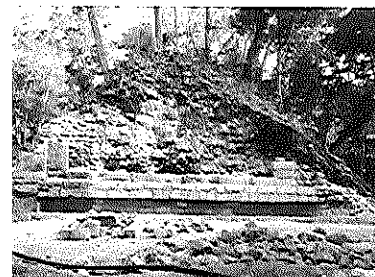

6. Se supervisó los trabajos de restauración en el cuerpo norte superior del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo y como parte del proceso se trabajó en la estabilización de 25 m² de muros en la fachada norte lado este de los taludes liberados.

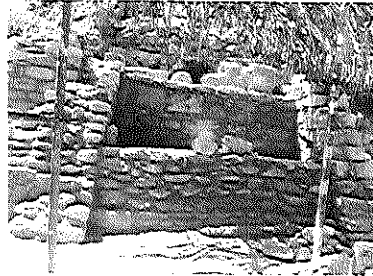

7. Se supervisó los trabajos de dibujo relacionados con la restauración de los diferentes edificios sobre los cuales se realizan trabajos, además se lleva el registro fotográfico de las actividades realizadas.

Raúl Eduardo Noriega Girón

Evelyn Lisette Samayoa Cornel
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCN
