

Licenciada  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 641-2019**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**, correspondiente **al mes de junio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A3 número correlativo 0026**.


**Actividades Realizadas:**

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio Arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-18 en el sitio Arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio B-17 en el sitio Arqueológico Naranjo.

## Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naranjo.

2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 12 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrando el esfuerzo en las áreas de la ciudad que son visitadas por el turismo local y extranjero. Con el trabajo realizado se resalta la volumetría del conjunto arquitectónico.

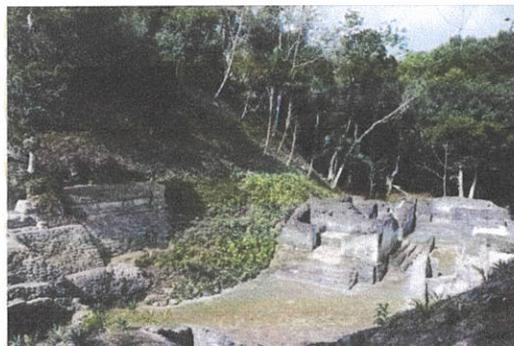

3. En el edificio B-24, en el sitio arqueológico Naranjo, en la esquina suroeste lado sur y oeste, se trabajó en la estabilización de 10 m<sup>2</sup> de sillares que dan forma a los relieves en el último cuerpo, para ello se resanó sisas y se desmontó sillares originales colocándolos nuevamente unidos y se estabilizó el núcleo utilizando como aglutinante mezcla hecha a base de cal.



Además en la fachada oeste se trabajó en el desenraizado y la eliminación de un tronco de un árbol de la especie conocida como ramón y en la recuperación de volumen perdido en el núcleo de la pirámide, se trabajó una superficie de 30 m<sup>2</sup> del talud en el penúltimo cuerpo de la esquina noroeste lado oeste.




4. En el edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo, se trabajó en la extracción del material acumulado alrededor del edificio producto de los escombros removidos, con esta actividad se recuperó la volumetría de la plaza central.



5. En el edificio B-17 se inicia con los trabajos de liberación de arquitectura existente, actividad previa a los trabajos de restauración que se tienen programados en el POA 2019 y se construyó el sistema de andamios que se utilizará para el abastecimiento de materiales utilizados en la restauración de la arquitectura que se exponga.



Raúl Eduardo Noriega Girón



Lic. Edin Hernández Fajés MSc.  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAH-DGFCYN

C.c. Administración DECORSIAP Archivo.
