

Guatemala, 31 de agosto 2016.
Informe 08-2016

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2016**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 24-2016, correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000076**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en el sitio arqueológico Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naranjo, donde se repararon 4 m² de techo con palma en la casa de descanso en el área arqueológica, 20 m² de techo de palma en el campamento.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 15 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo.
3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las siguientes actividades:

- Estabilización de 12 m² de talud y relleno constructivo en el segundo cuerpo de la fachada oeste al norte de la escalinata central, en donde se desmontó el muro por encontrarse dañado por la formación de grietas y material suelto en el relleno constructivo.





- Estabilización de 10 m² del núcleo constructivo en el cuarto cuerpo en la fachada este, para lo que fue necesario recuperar aproximadamente 15 m³ de relleno constructivo.



4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 en donde se realizaron las siguientes actividades:

- Se trabajó 40 m² de muro en el área liberada en la fachada sur del cuerpo que sustenta los relieves, para lo que fue necesario recuperar aproximadamente 40 m³ del talud, trabajo hecho con piedra y mezcla hecha a base de cal.

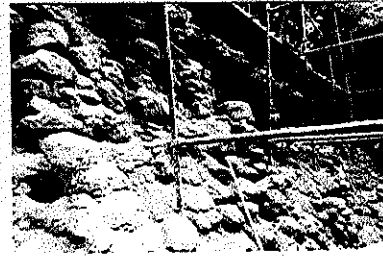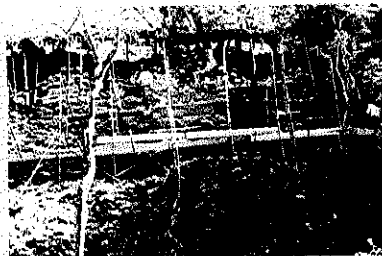



5. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio A-3 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la reconstrucción de la moldura en la base del cuerpo tomando como referencia para sus proporciones los vestigios de los elementos originales que aún se conservan.



6. se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo en donde se restauraron 30 m² entre escalinatas y cuerpos liberados en la fachada este para lo que se utilizó piedra y mezcla hecha a base de cal.




Raúl Eduardo Noriega Girón


Edin Robel Hernandez Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEH-DGPCN

C.c. Administración DECORSIAP. Archivo.
