

Guatemala, 30 de septiembre 2016.
Informe 09-2016

Licenciado
Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2016**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 24-2016, correspondiente al **mes de septiembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000078**.


Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en el sitio arqueológico Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.


Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naranjo, donde se reparó 30 m² de caballete en el techo del dormitorio del personal de apoyo.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo en donde por el huracán Earl cayeron más de 144 árboles.
3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las siguientes actividades:

- Estabilización de 20 m² de talud y relleno constructivo a lo largo de los cuerpos de la fachada oeste, en donde se desmontó parte del en la parte superior removiendo el material suelto en la parte y sustituyéndolo con nuevo relleno constructivo hecho con piedra y mezcla a base de cal.



- Se consolidó las sisas de 22 m² de la escalinata central en la fachada oeste, para lo cual se removió el material suelto sustituyéndolo con nueva mezcla hecha a base de cal.

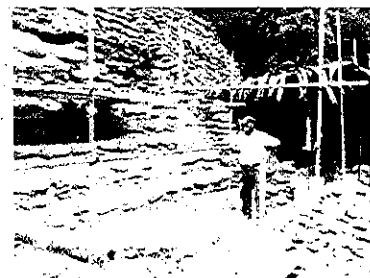

4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 en donde se realizaron las siguientes actividades:

- Se trabajó 19 m² de muro en el área liberada en la fachada sur del cuerpo que sustenta los relieves, para lo que fue necesario recuperar aproximadamente 13 m³ de volumen en el talud, trabajo hecho con piedra y mezcla hecha a base de cal.





5. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio A-3 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la reconstrucción de la moldura en la base del cuerpo en la esquina suroeste, tomando como referencia los elementos originales que aún se conservan, se restauró 7.5 m² de muro.



6. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo en donde se restauraron 20 m² en los cuerpos liberados en la fachada este para lo que se utilizó piedra y mezcla hecha a base de cal.




Raúl Eduardo Noriega Girón


Edin Robel Hernández Paiz
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IOAEP-AGPCN

C.c. Administración DECORSIAP. Archivo.
