

Parque Nacional Tikal, 28 de Febrero/ 2019.  
Informe No.2-2019.

Licda. Gladys Elizabeth Palala Gálvez.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Pálala Gálvez.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 686-2019** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 8-2019**, correspondiente al mes de febrero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie C y número 000246..

**Actividades Realizadas, mes de Febrero. 2,019.**

1. Limpieza mecánica en seco y húmedo, a monumentos In-Situ: Complejos Q, P, N. Petro-grabado, Señor de los espejos, Recinto de Templo II, Templo IV, Estructuras: 5D-33, 5D-43.
2. Extracción de tierra blanca, material que se utilizara en los trabajos de mantenimiento arquitectónico del palacio A-V. Uaxactún.
3. Traslado de piedra laja de caliza para embono, material que se utilizara en la restauración de Estructura 5D-105.
4. Traslado de bloques labrados de caliza, hacia la plaza Oeste. Material que se utilizara en la restauración de Estructura 5D-15.
5. Traslado de bloques labrados de caliza, hacia la bodega de Templo III. Material que se utilizara para los trabajos de restauración de Templo I.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se realizó chapeo de maleza y grama: plaza este, central, y oeste, grupo A. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo se realizó deshierbe en las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X.. Grupo. E.

## Resultados Logrados, mes de Febrero/2019.

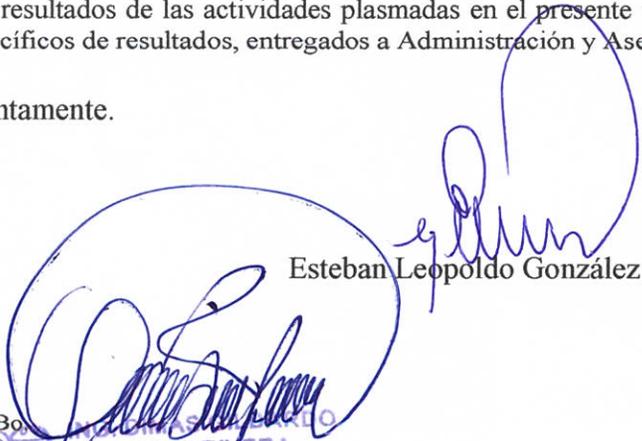
1. Se verifico el trabajo de limpieza mecánica, en seco y húmedo: En monumentos de los Complejos Q, P, N. Petro-grabado, Señor de los espejos, Recinto de Templo II, Templo IV, Estructuras: 5D-33, 5D. El Trabajo consiste en eliminar telas de araña, moscas que taladran la piedra, restos de tierra, así mismo, la microflora que crece por humedad en paramentos de muros y plataformas piramidales de templos, palacios y estructuras. (Total 520 m2).
2. Se verifico los trabajos de extracción de tierra blanca. El material se utilizara en los trabajos de mantenimiento arquitectónico, que se realizan en el palacio A-V, sitio arqueológico de Uaxactún. (Total 7 m3).
3. Se verifico el traslado de piedra laja para embono, hacia la Estructura 5D-105, ubicada en el costado Este de Templo V. El material se utilizara en los trabajos de restauración y conservación de la Estructura 5D-105. (Total 15 m3).
4. Se verifico el traslado de los bloques de caliza, hacia la plaza Oeste. El material se utilizara en los trabajos de restauración y conservación de la Estructura 5D-15. (Total 155 bloques de 0.60 x 0.40 x 0.35).
5. Se verifico El traslado los bloques de caliza, hacia la bodega de Templo III. Material que se utilizara para los trabajos de restauración y conservación de Templo I (Total 150 Sillares de 0.60 x 0.40 x 0.35).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, sitio arqueológico de Uaxactún. Chapeo de maleza y grama; plaza central, y oeste, grupo E. Como también, la calzada que une al grupo: D y E. Así mismo se realizó deshierbe en las estructuras: A-II, A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. Grupo. A. (Total 6,500 m2).

### Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.

Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.   
PEREZ RIVERA  
SUB ADMINISTRADOR  
PARQUE NACIONAL TIKAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
