

Antigua Guatemala, 29 de diciembre 2017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho


Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico prestados a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Número 2760-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 749-A-2017, correspondiente al mes de Diciembre 2017, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura Serie A número 0071.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Sitio Web Museo de Santiago Sacatepequez


- Apoyo en diseño de sitio web
- Apoyo en maquetación de sitio web
- Apoyo en adquisición de dominios
- Apoyo en configuración del servidor
- Apoyo en implementación del sitio Web
- Apoyo en la realización de Pruebas y Control de calidad

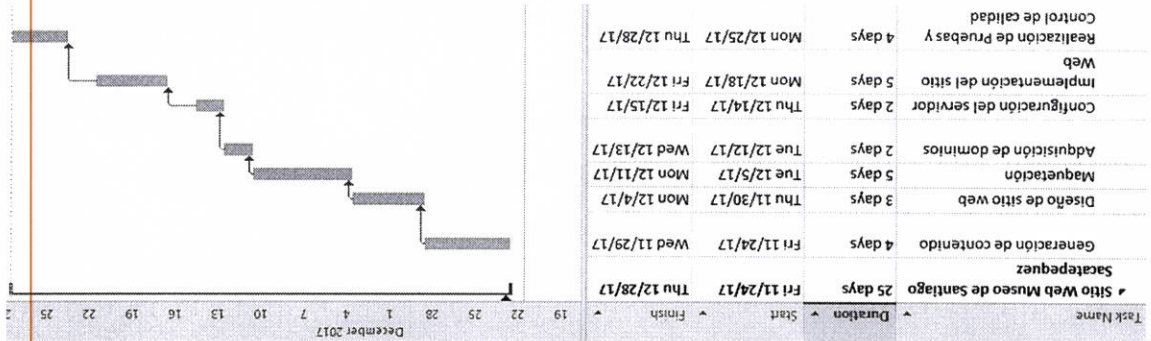

RESULTADOS OBTENIDOS:

1. Las actividades presentadas en el cronograma fueron desarrolladas exitosamente.

Aldo Roberto Gatica Ramirez



Licda. Fénida Sayomara Morales Mancilla
Directora
Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural



Vo.Bo.

Antigua Guatemala, 29 de diciembre 2017

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Vicerministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico prestados a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Número 2760-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 749-A-2017, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

SEPTIEMBRE

Sitio Web Museo de Arte Colonial

- Apoyo en la generación de contenido
 - Apoyo en la toma de imágenes para sitio web
 - Apoyo en la edición de fotografías para sitio web
- Apoyo en diseño de sitio web
- Apoyo en Maquetación del sitio web
- Apoyo en Adquisición de dominios
- Apoyo en Configuración del servidor para alojar el sitio


Task Name	Duration	Start	Finish
▲ Consultoría Museos Colonial	79 days	Mon 9/11/17	Thu 12/28/17
▲ Sitio Web Museo de Arte Colonial	29 days	Mon 9/11/17	Thu 10/19/17
Generación de contenido	4 days	Mon 9/11/17	Thu 9/14/17
Diseño de sitio web	3 days	Mon 9/18/17	Wed 9/20/17
Maquetación	5 days	Thu 9/21/17	Wed 9/27/17
Adquisición de dominios	2 days	Thu 9/28/17	Fri 9/29/17

OCTUBRE:

Sitio Web Museo de Arte Colonial

- Apoyo en Implementación del sitio Web
 - Apoyo en la realización de Pruebas y Control de calidad
- ##### Sitio Web Museo del Libro Antiguo
- Apoyo en la Generación de contenido
 - Apoyo en la toma de imágenes para sitio web

- Apoyo en la edición de fotografías para sitio web
- Apoyo en diseño de sitio web
- Apoyo en Maquetación

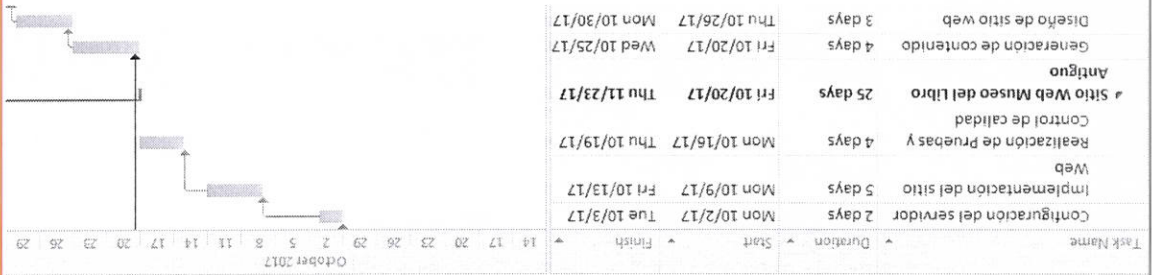

NOVIEMBRE

Se dio apoyo en lo siguiente:

Sitio Web Museo del Libro Antiguo

- Apoyo en Maquetación
- Apoyo en Adquisición de dominios
- Apoyo en Configuración del servidor
- Apoyo en Implementación del sitio Web
- Apoyo en Realización de Pruebas y Control de calidad

Sitio Web Museo de Santiago Sacatepéquez

- Apoyo en Generación de contenido
- Apoyo en la toma de imágenes para sitio web
- Apoyo en la edición de fotografías para sitio web




DICIEMBRE


Sitio Web Museo de Santiago Sacatepéquez

- Apoyo en diseño de sitio web
- Apoyo en maquetación de sitio web
- Apoyo en adquisición de dominios
- Apoyo en configuración del servidor

- Apoyo en implementación del sitio Web
- Apoyo en la realización de Pruebas y Control de calidad

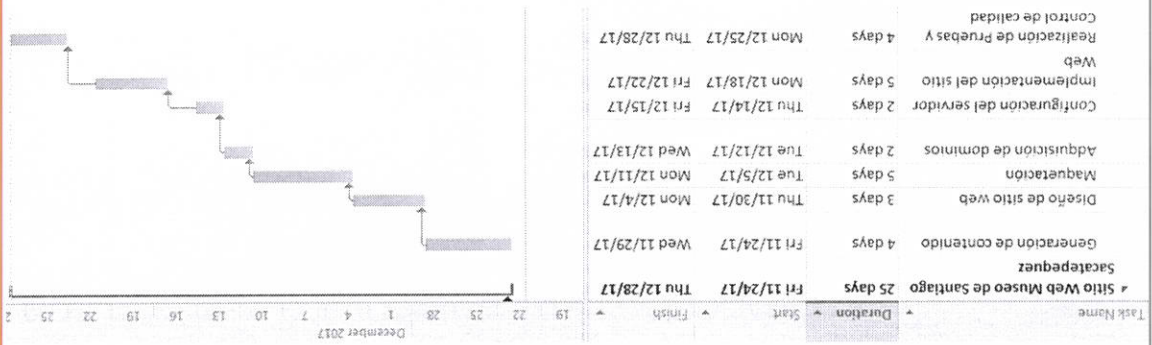

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

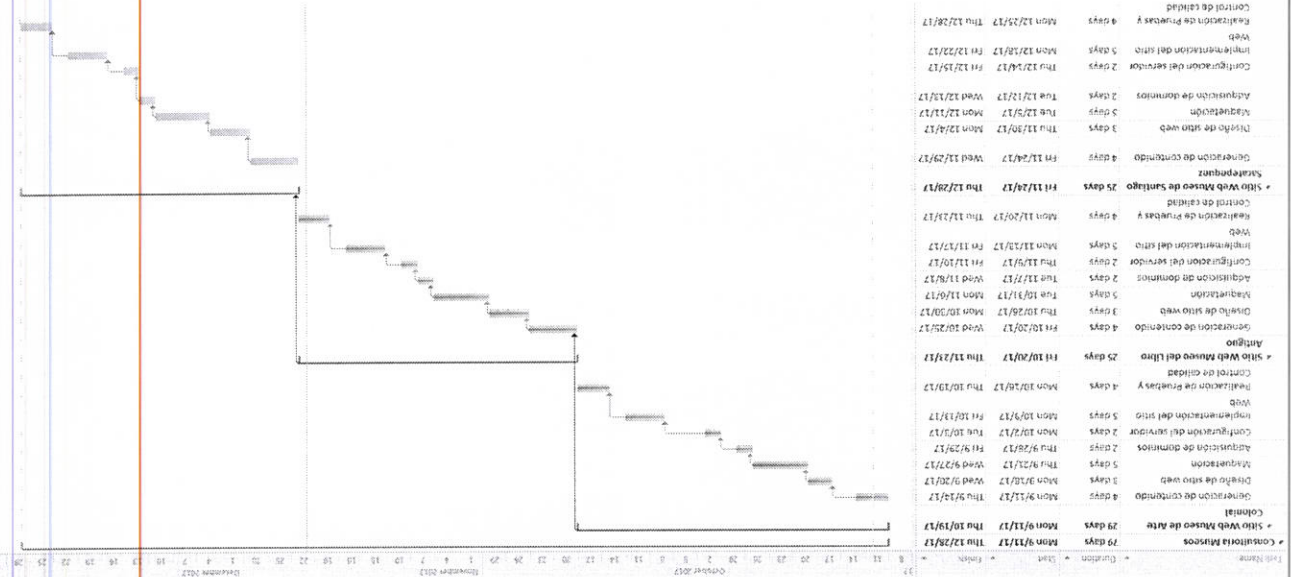

Aldo Roberto Gatica Ramirez

Vo. Bo.

Antigua Guatemala, 29 de diciembre 2017

Licenciada
 Gladys Elizabeth Palala Gálvez
 Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
 Su Despacho

Estimada Licenciada Palala:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de resultados obtenidos conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico prestados a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Número 2760-2017, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 749-A-2017, correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2017.

RESULTADOS CUALITATIVOS:


A continuación se presentan las actividades realizadas y el porcentaje completado para cada actividad:

Descripción	Duración	Inicio	Fin	% Completado
Consultoría Museos	79 days	Mon 9/11/17	Thu 12/28/17	100%
Sitio Web Museo de Arte Colonial	29 days	Mon 9/11/17	Thu 10/19/17	100%
Generación de contenido	4 days	Mon 9/11/17	Thu 9/14/17	100%
Diseño de sitio web	3 days	Mon 9/18/17	Wed 9/20/17	100%
Maquetación	5 days	Thu 9/21/17	Wed 9/27/17	100%
Adquisición de dominios	2 days	Thu 9/28/17	Fri 9/29/17	100%
Configuración del servidor	2 days	Mon 10/2/17	Tue 10/3/17	100%
Implementación del sitio Web	5 days	Mon 10/9/17	Fri 10/13/17	100%
Realización de Pruebas y Control de calidad	4 days	Mon 10/16/17	Thu 10/19/17	100%
Sitio Web Museo del Libro Antiguo	25 days	Fri 10/20/17	Thu 11/23/17	100%
Generación de contenido	4 days	Fri 10/20/17	10/25/17	100%
Diseño de sitio web	3 days	Thu	Mon	100%

Se realizaron 3 sitios web correspondientes al Museo del Libro Antiguo, Museo de Arte Colonial y al Museo de Santiago Sacatepéquez.

RESULTADOS CUANTITATIVOS:

100%	Tue	10/31/17	Mon 11/6/17	5 days	Maquetación	100%
100%	Tue	10/26/17	Wed 11/7/17	2 days	Adquisición de dominios	100%
100%	Mon	11/13/17	Thu 11/9/17	2 days	Configuración del servidor	100%
100%	Mon	11/20/17	Fri 11/17/17	5 days	Implementación del sitio Web	100%
100%	Mon	11/20/17	Thu 11/23/17	4 days	Realización de Pruebas y Control de calidad	100%
100%	Fri 11/24/17	Fri 11/24/17	Thu 12/28/17	25 days	Sitio Web Museo de Santiago Sacatepéquez	100%
100%	Wed	11/29/17	Mon 12/4/17	4 days	Generación de contenido	100%
100%	Thu	11/30/17	Mon 12/4/17	3 days	Diseño de sitio web	100%
100%	Mon	12/11/17	Mon 12/11/17	5 days	Maquetación	100%
100%	Tue	12/12/17	Wed 12/13/17	2 days	Adquisición de dominios	100%
100%	Thu	12/14/17	Fri 12/15/17	2 days	Configuración del servidor	100%
100%	Mon	12/18/17	Fri 12/22/17	5 days	Implementación del sitio Web	100%
100%	Mon	12/25/17	Thu 12/28/17	4 days	Realización de Pruebas y Control de calidad	100%



Directora
 Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Licda. Enaida Sayonara Morales Morales
 Vo.Bo.


Aldo Roberto Gatica Ramirez

1. Se desarrollaron los 3 sitios web correspondientes al Museo de Santiago Sacatepéquez, Museo del Libro Antiguo y Museo de Arte Colonial.

RESULTADOS CUANTITATIVOS OBTENIDOS:

1. Se apoyó en el desarrollo de los sitios web con la generación de contenido, diseño, maquetación, configuración del servidor, implementación del sitio web y la realización de pruebas y control de calidad.

RESULTADOS CUALITATIVOS OBTENIDOS:

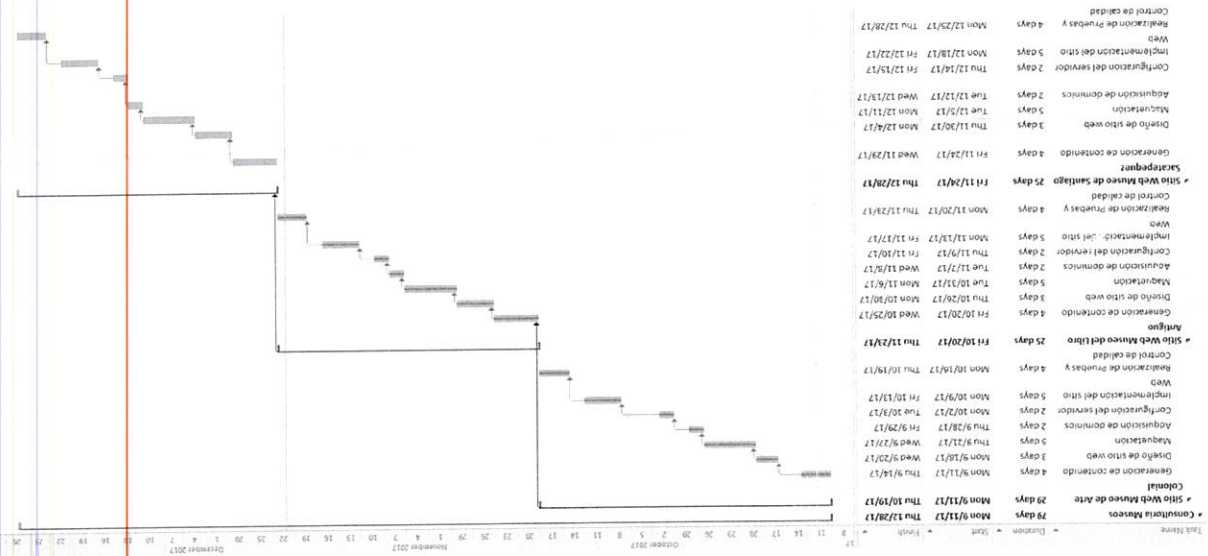

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

